



데크플레이트 설치 작업 중 추락



재해개요


2025. 6. 00.(월) 08:06경 대구 북구 소재

0000 신축공사 현장에서 2층 바닥

데크플레이트 설치 작업 중 철골 보에 걸쳐진

데크플레이트가 탈락하며 추락하였고,

병원에서 치료 중 사망함(H ≒ 6m)

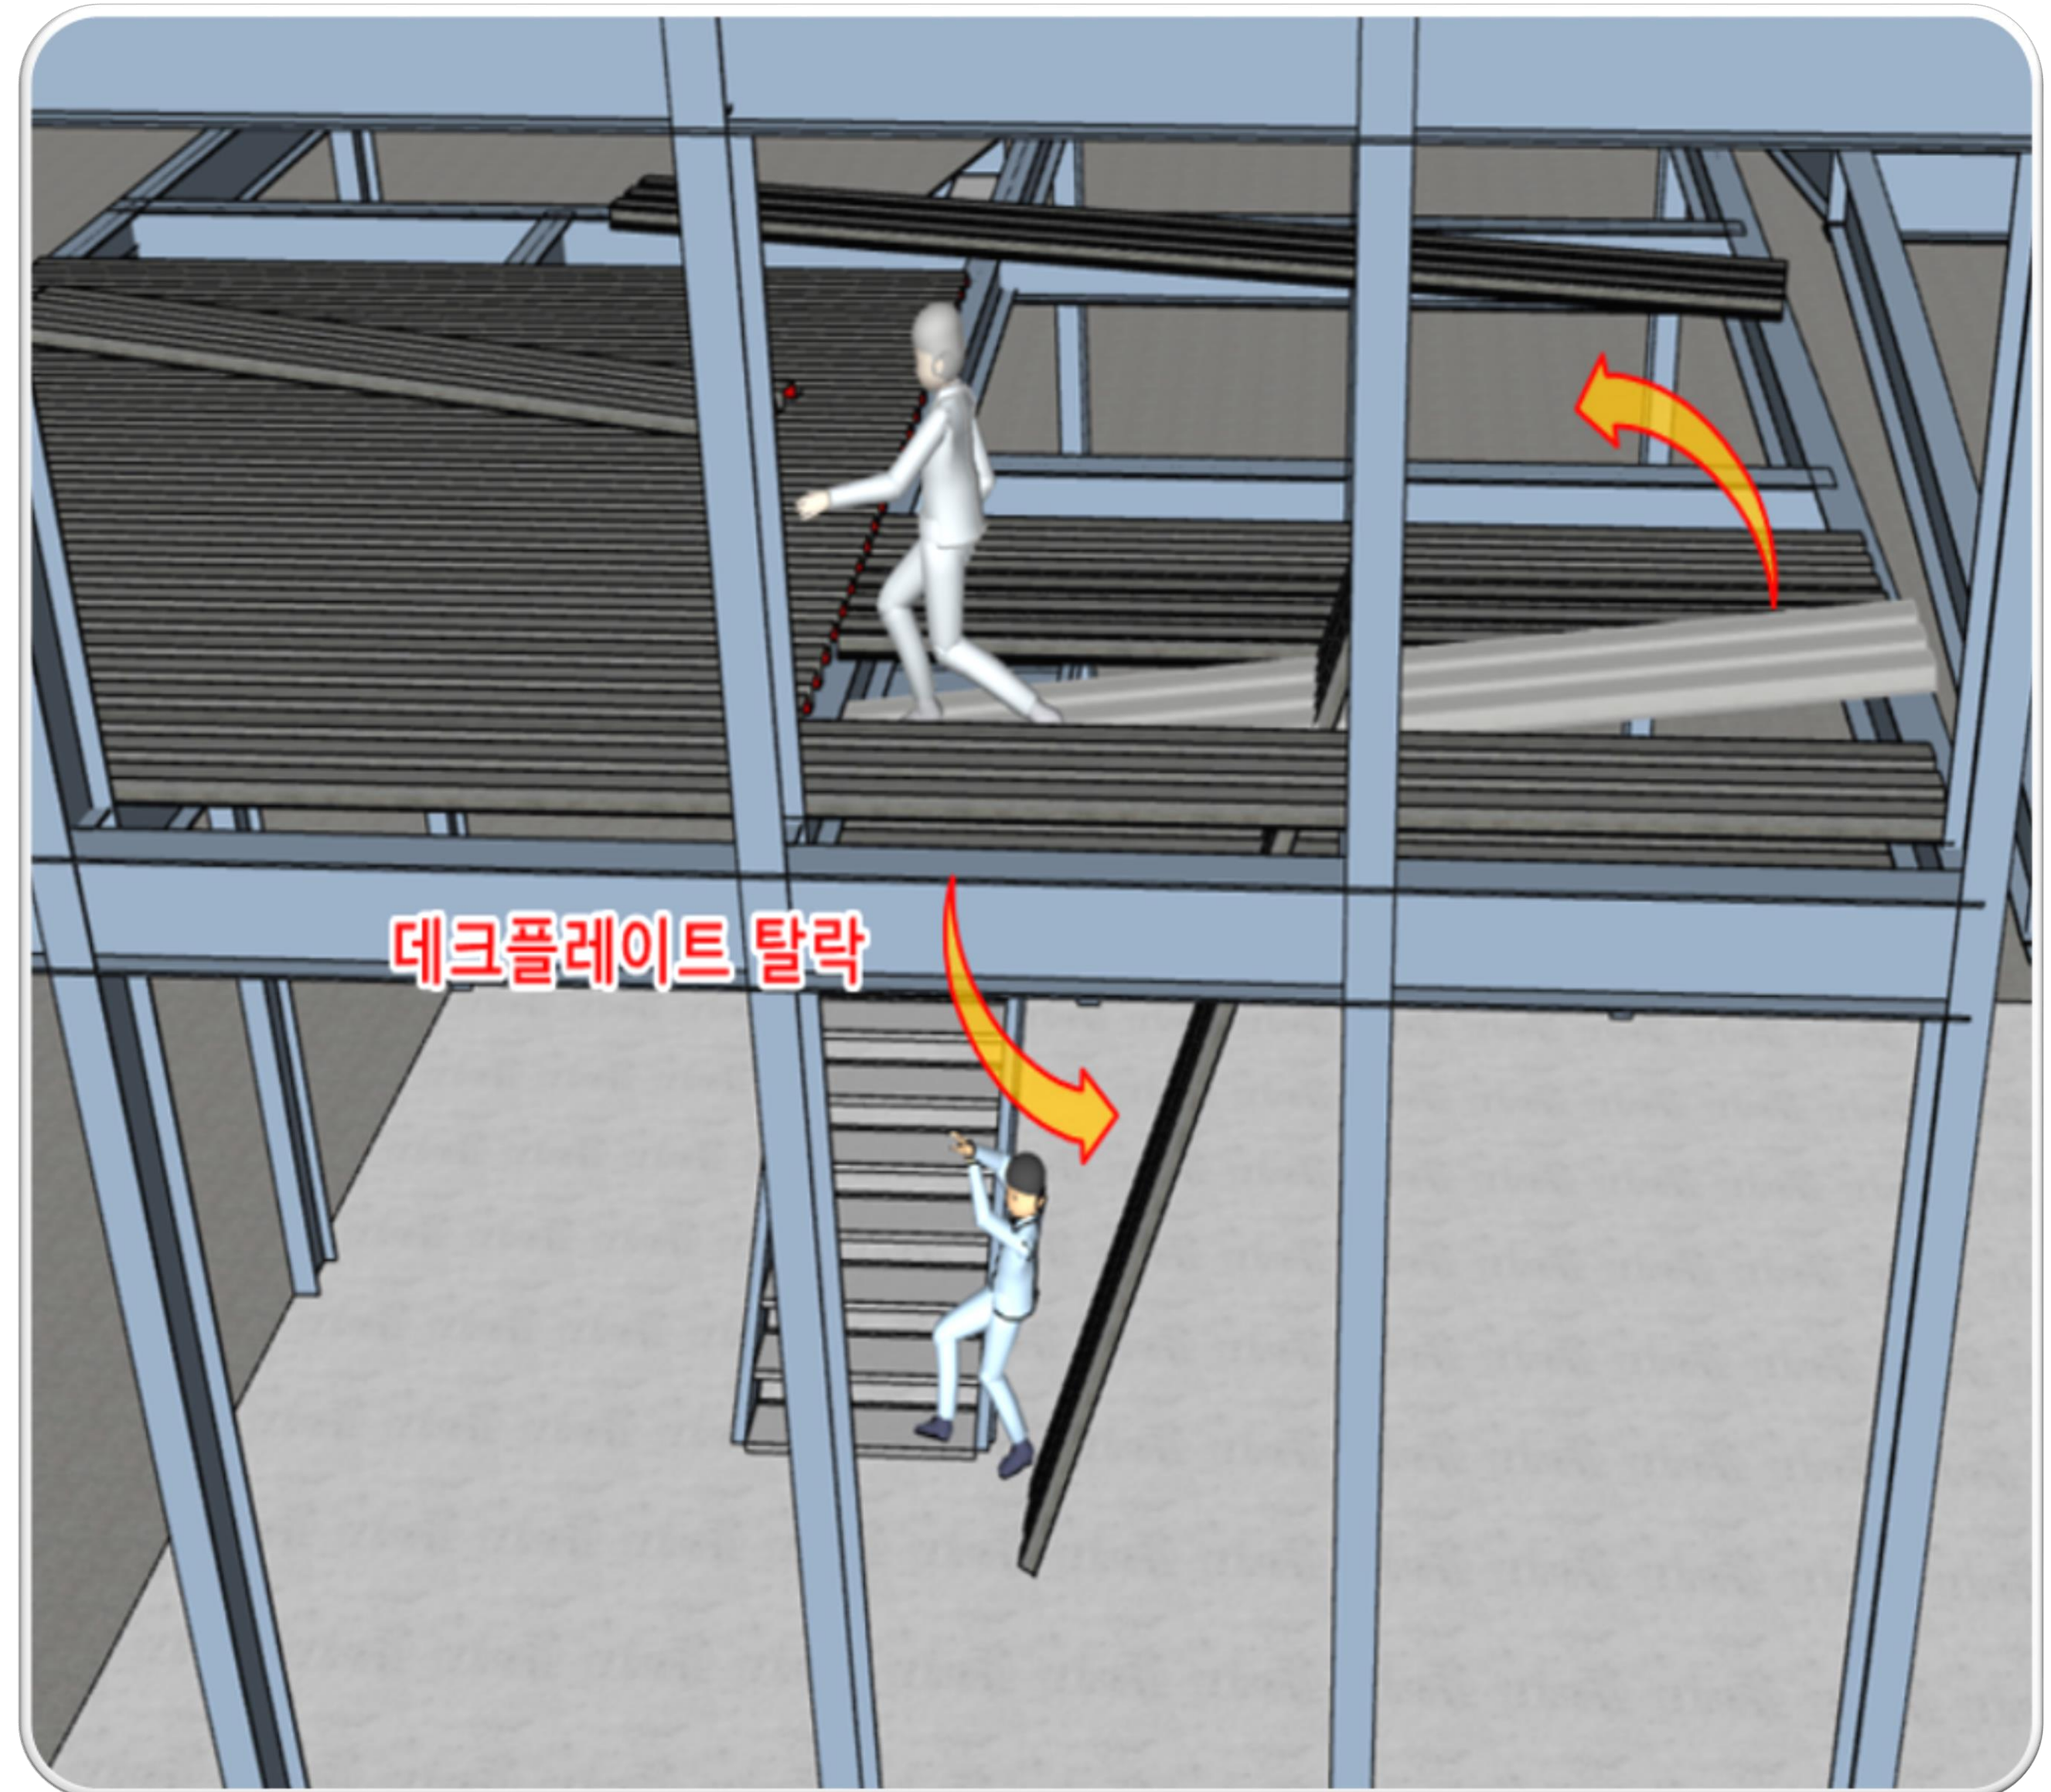

발생원인

▶ 데크플레이트 설치 작업 시 고정 미실시

- 철골 보 위에 데크플레이트 설치 시 충분한 걸침 길이를 확보하고, 철골 보와 데크플레이트를 견고히 고정하여야 하나, 고정되지 않은 상태로 작업

▶ 고소작업 시 추락 방호조치 미실시

- 데크플레이트 설치 작업과 같은 고소작업 시 추락 위험에 대비하여 추락방호망을 설치하거나 안전대 부착설비를 설치하는 등의 추락 방지조치를 하여야하나, 미실시

예방대책

1 데크플레이트 설치 작업 시 고정 철저

- 철골 보 위에 데크플레이트 설치 시 충분한 걸침 길이를 확보하고, 데크플레이트의 양 끝단을 용접 등으로 철골 보에 고정시켜 탈락을 방지할 것

2 데크플레이트 설치 작업 시 추락방지조치 철저

- 고소작업 시 견고한 구조로 설치하고, 추락방호망 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착설비를 설치하여야 함
- 안전대 부착설비를 설치한 경우 작업자에게 안전대를 착용하도록 하여 이동하거나 작업을 하는 경우 안전대 혹은 부착설비에 체결하도록 관리하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
