





데크플레이트 작업 중 추락



재해개요

2025. 05. 23.(금) 11:12경 충남 공주시 소재 증축 공사 현장에서, 재해자가 지상 3층 데크플레이트 단부 콘크리트 스토퍼* 설치를 위해 실측하던 중, 지상 콘크리트 바닥으로 떨어져(H≒10.5M) 당일 사망함.

*스토퍼: 데크플레이트 외측면 가장자리 부위에 설치되는 부속자재

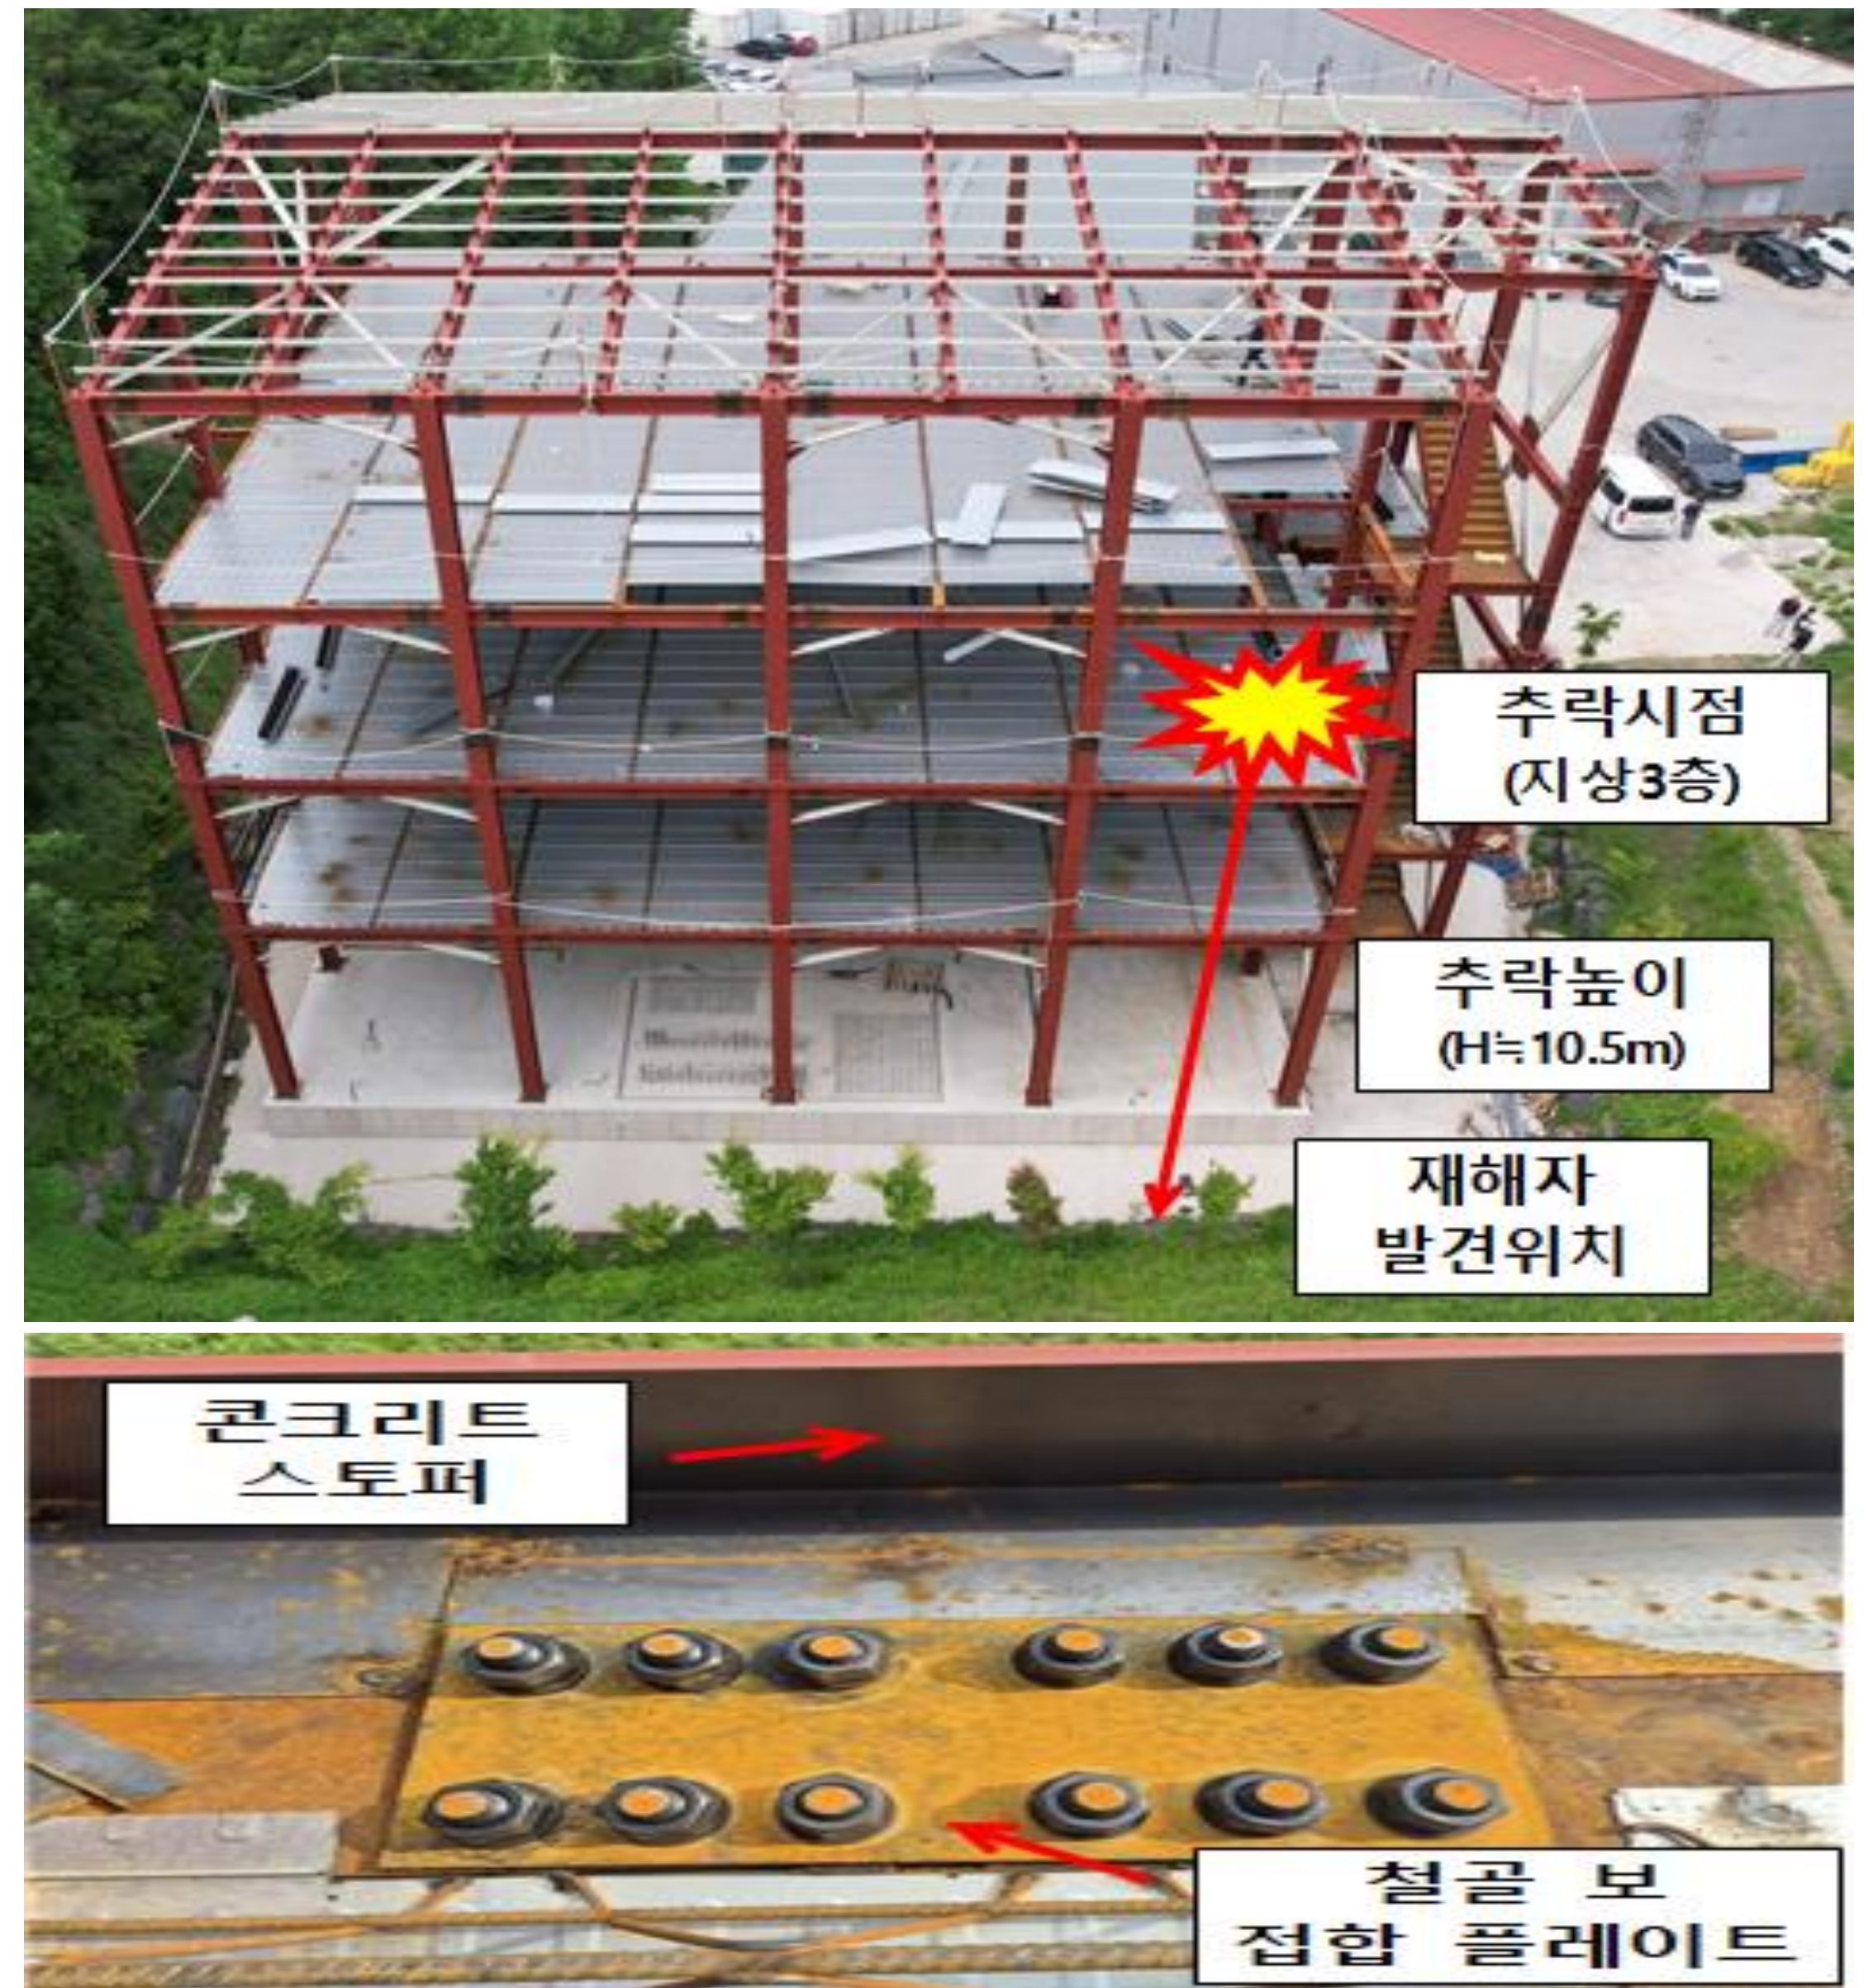

발생원인

▶ 데크플레이트 단부 추락방호조치 미흡

- 판개작업이 완료된 데크플레이트 단부에 안전난간 또는 추락방호망 등의 설치가 되지 않았고, 안전대 부착설비가 설치되어 있었으나 안전대 고리 체결 등이 이루어 지지 않았음.

▶ 철근에 걸려 넘어질 위험이 있는 데크플레이트 위로 이동

- 데크플레이트 상부를 이동시, 철근에 걸려 넘어져 단부로 떨어지거나 물체에 부딪힐 위험 미조치.



예방대책

① 데크 플레이트 단부 추락방호조치 철저


- 추락 위험이 있는 데크플레이트 단부에는 안전난간, 수직형 추락방망 등의 충분한 강도를 가진 구조의 추락방호조치를 하여야 함.

② 항시 안전하게 사용 가능한 통로 확보

- 데크플레이트 위에 합판 등을 설치하여 항시 안전하게 사용할 수 있는 통로를 확보하여야 함.

③ 데크플레이트 외측에 설치되는 스토퍼 작업방법 개선

- 현장 내 부지 여건을 고려한 작업(고소작업대 설치, 철골 외측 시스템 비계 조립) 등 작업방법 개선 검토 및 적용 필요.

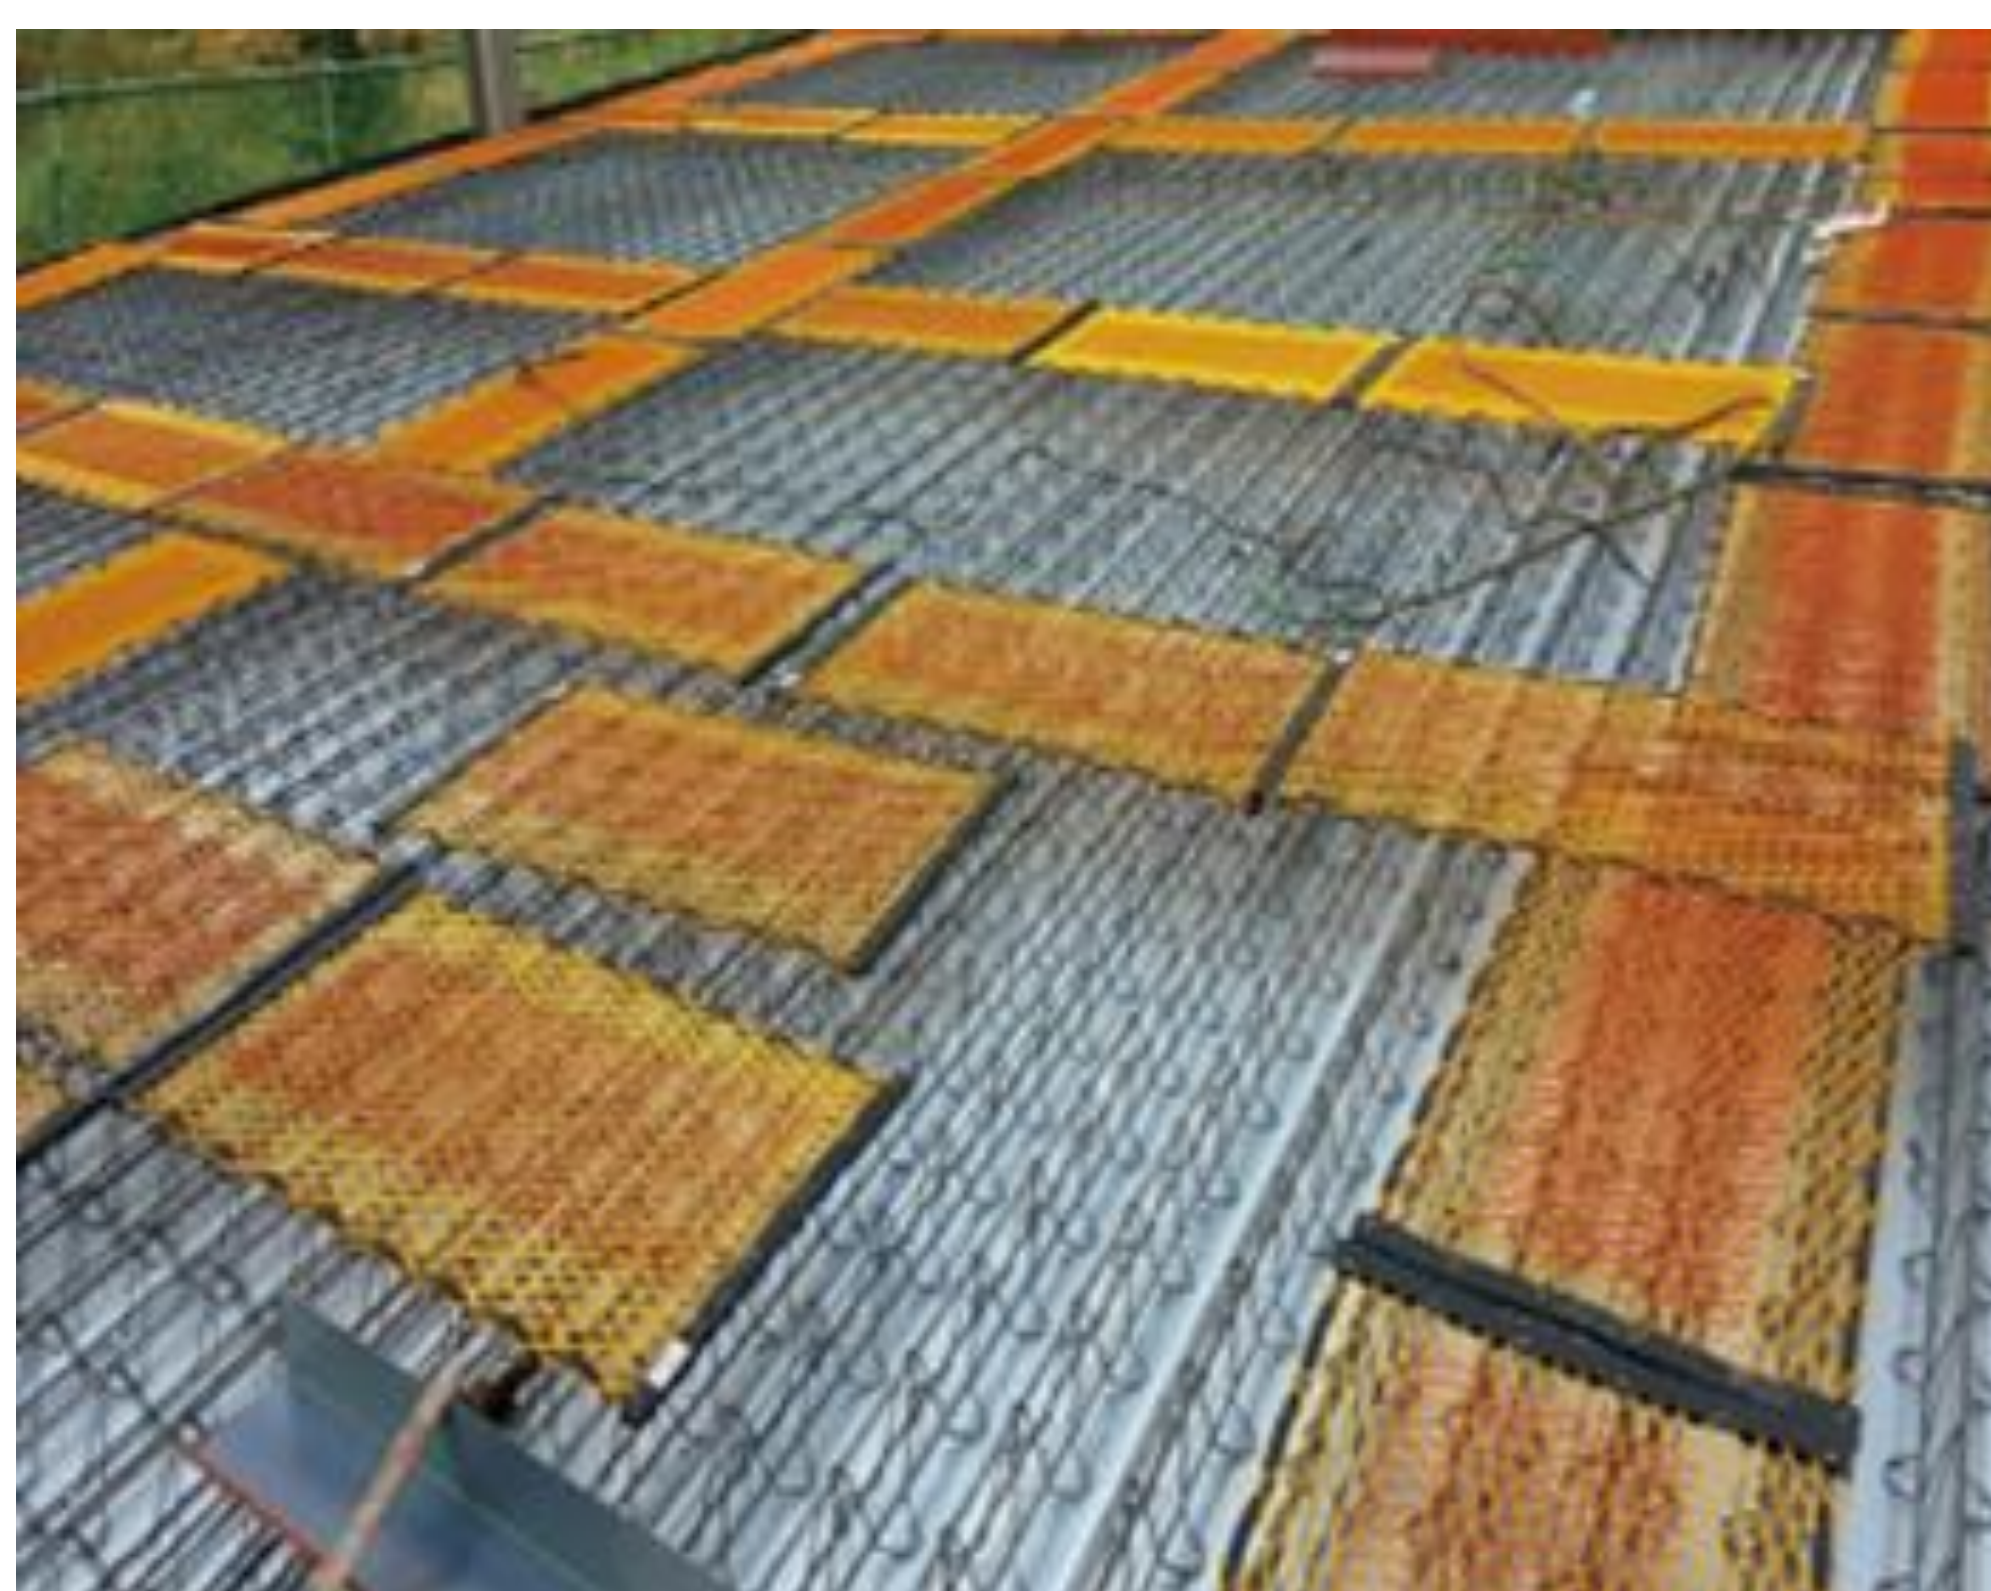

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려 드립니다.
