


시스템비계 설치 작업 중 추락



☀ 재해개요

2025. 9. 00. (화) 00:00 경 충북 음성군
소재 철근콘크리트 목업(Mock-up)*
공사현장에서 시스템비계 설치작업 중
3단(중간 난간에 일부 미설치)에서
중심을 잃고 바닥으로 추락함

* 실제 프로젝트에 제안된 것과 동일한 재료 및 방법을
사용하여 만들어진 건축용 콘크리트 샘플

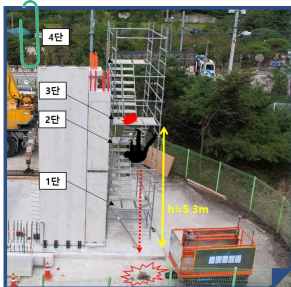

1

🔍 발생원인

안전난간 누락

- 재해 발생 지점인 3단 및 다른 층은 추락의 위험이 있지만, 중간 안전 난간대가 일부 설치되어 있지 않았음

작업 발판 누락

- 도면과 다르게 작업 발판을 부족하게 설치하여 발이 빠질 위험이 있었음

안전대 부착설비 미설치

- 재해발생 시스템 비계는 높이 2미터 이상으로 추락 위험 장소이지만, 안전대 고리를 걸 수 있는 별도의 안전대 부착설비가 설치되어 있지 않음

2

💡 예방대책

① 추락 방호 조치 철저

- 시스템 비계 설치 시 도면에 따라 가설재를 누락 없이 설치하고, 설치 순서를 준수하여야 함
- 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전하게 작업 할 수 있도록 안전 난간(상부 및 중간 난간대) 혹은 추락 방호망을 설치하여야 함
- 설치하기 어려운 경우, 근로자가 안전대 고리를 걸 수 있는 안전대 부착설비를 설치하여야 함

본 OPS는 동종재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
