




적재품 정리 작업 중 추락



재해개요



2025. 09. 00.(금) 15:07경

경남 창원시 소재의 목재 보세창고 현장에

적재된 목재 단(약 4.5M) 상부에서

목재 단을 덮고 있던 방수포를 걷어내던 중,

목재 단 아래로 추락

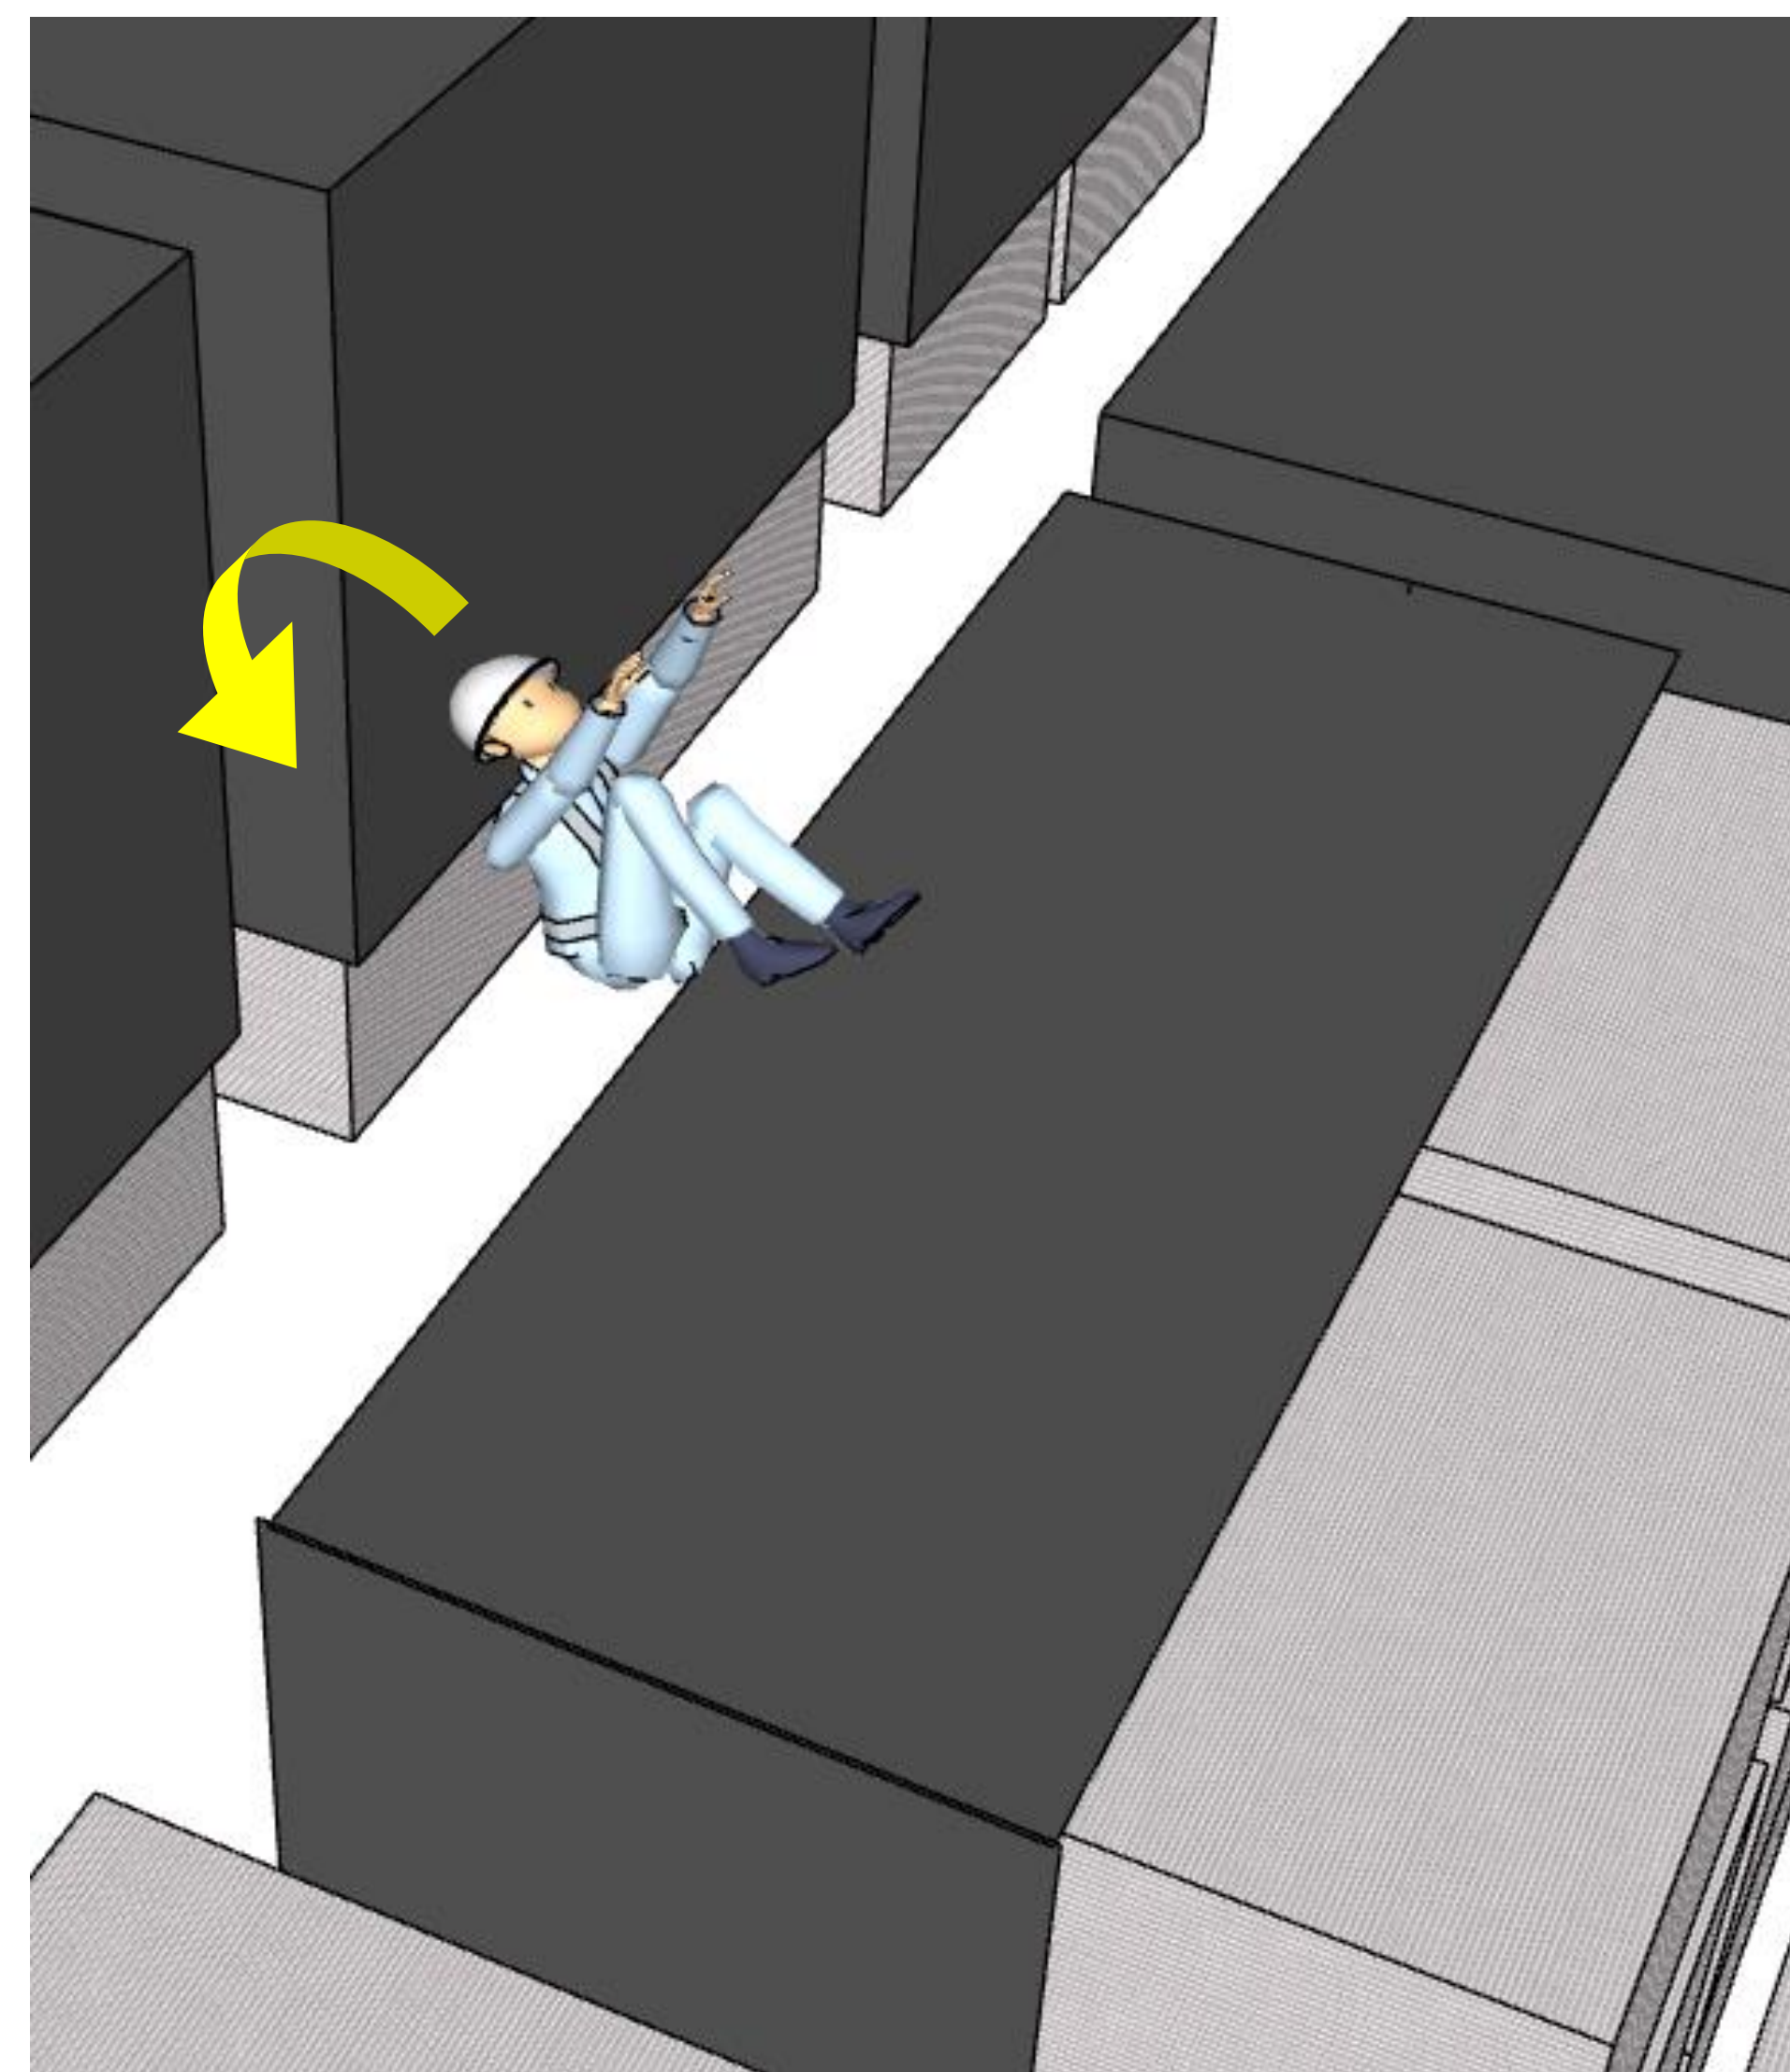

발생원인

▶ 추락방지조치 미실시

- 상부로의 안전한 통로 미확보 및 단 상부에 추락 방지조치 미실시

▶ 개인보호구 미착용

- 추락 시 신체를 보호할 수 있는 개인보호구(안전모 등)를 미착용함

▶ 재해발생공정 위험성평가 미실시

- 재해 발생공정에 대한 유해·위험요인 발굴 미실시하여 위험요인 인지 부족



예방대책

1 작업 환경에 적합한 추락 방지조치 실시

- 목재 적재 단 주변에 작업 간 활용 가능한 안전대 부착설비* 를 설치
- 작업개시 전 안전대 및 안전모 착용여부 확인 철저

* 지주를 활용한 수평구멍줄 또는 포스트형 안전대 부착설비 등

2 사전 위험성평가 실시 및 작업계획서 작성·준수 철저

- 위험 작업 전 현장 사전조사를 바탕으로 한 위험성평가 실시
- 작업 간 발생가능한 위험을 예방할 수 있는 구체적 안전대책을 포함한 작업계획서 작성 및 관리감독 철저

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
