



벌도목 조재 작업 중 맞음



재해개요

2024. 01. 00.(금) 08:12경 부산광역시 기장군



소재 000 현장에서 지장목*에 걸린 벌도목

아래에서 조재 작업* 중 벌도목이 회전하면

서 맞아 작업자 1인이 사망함

* 지장목: 벌목 시 방해되는 인접목

* 조재 작업: 벌목한 나무를 적당한 크기로 절단하는 작업

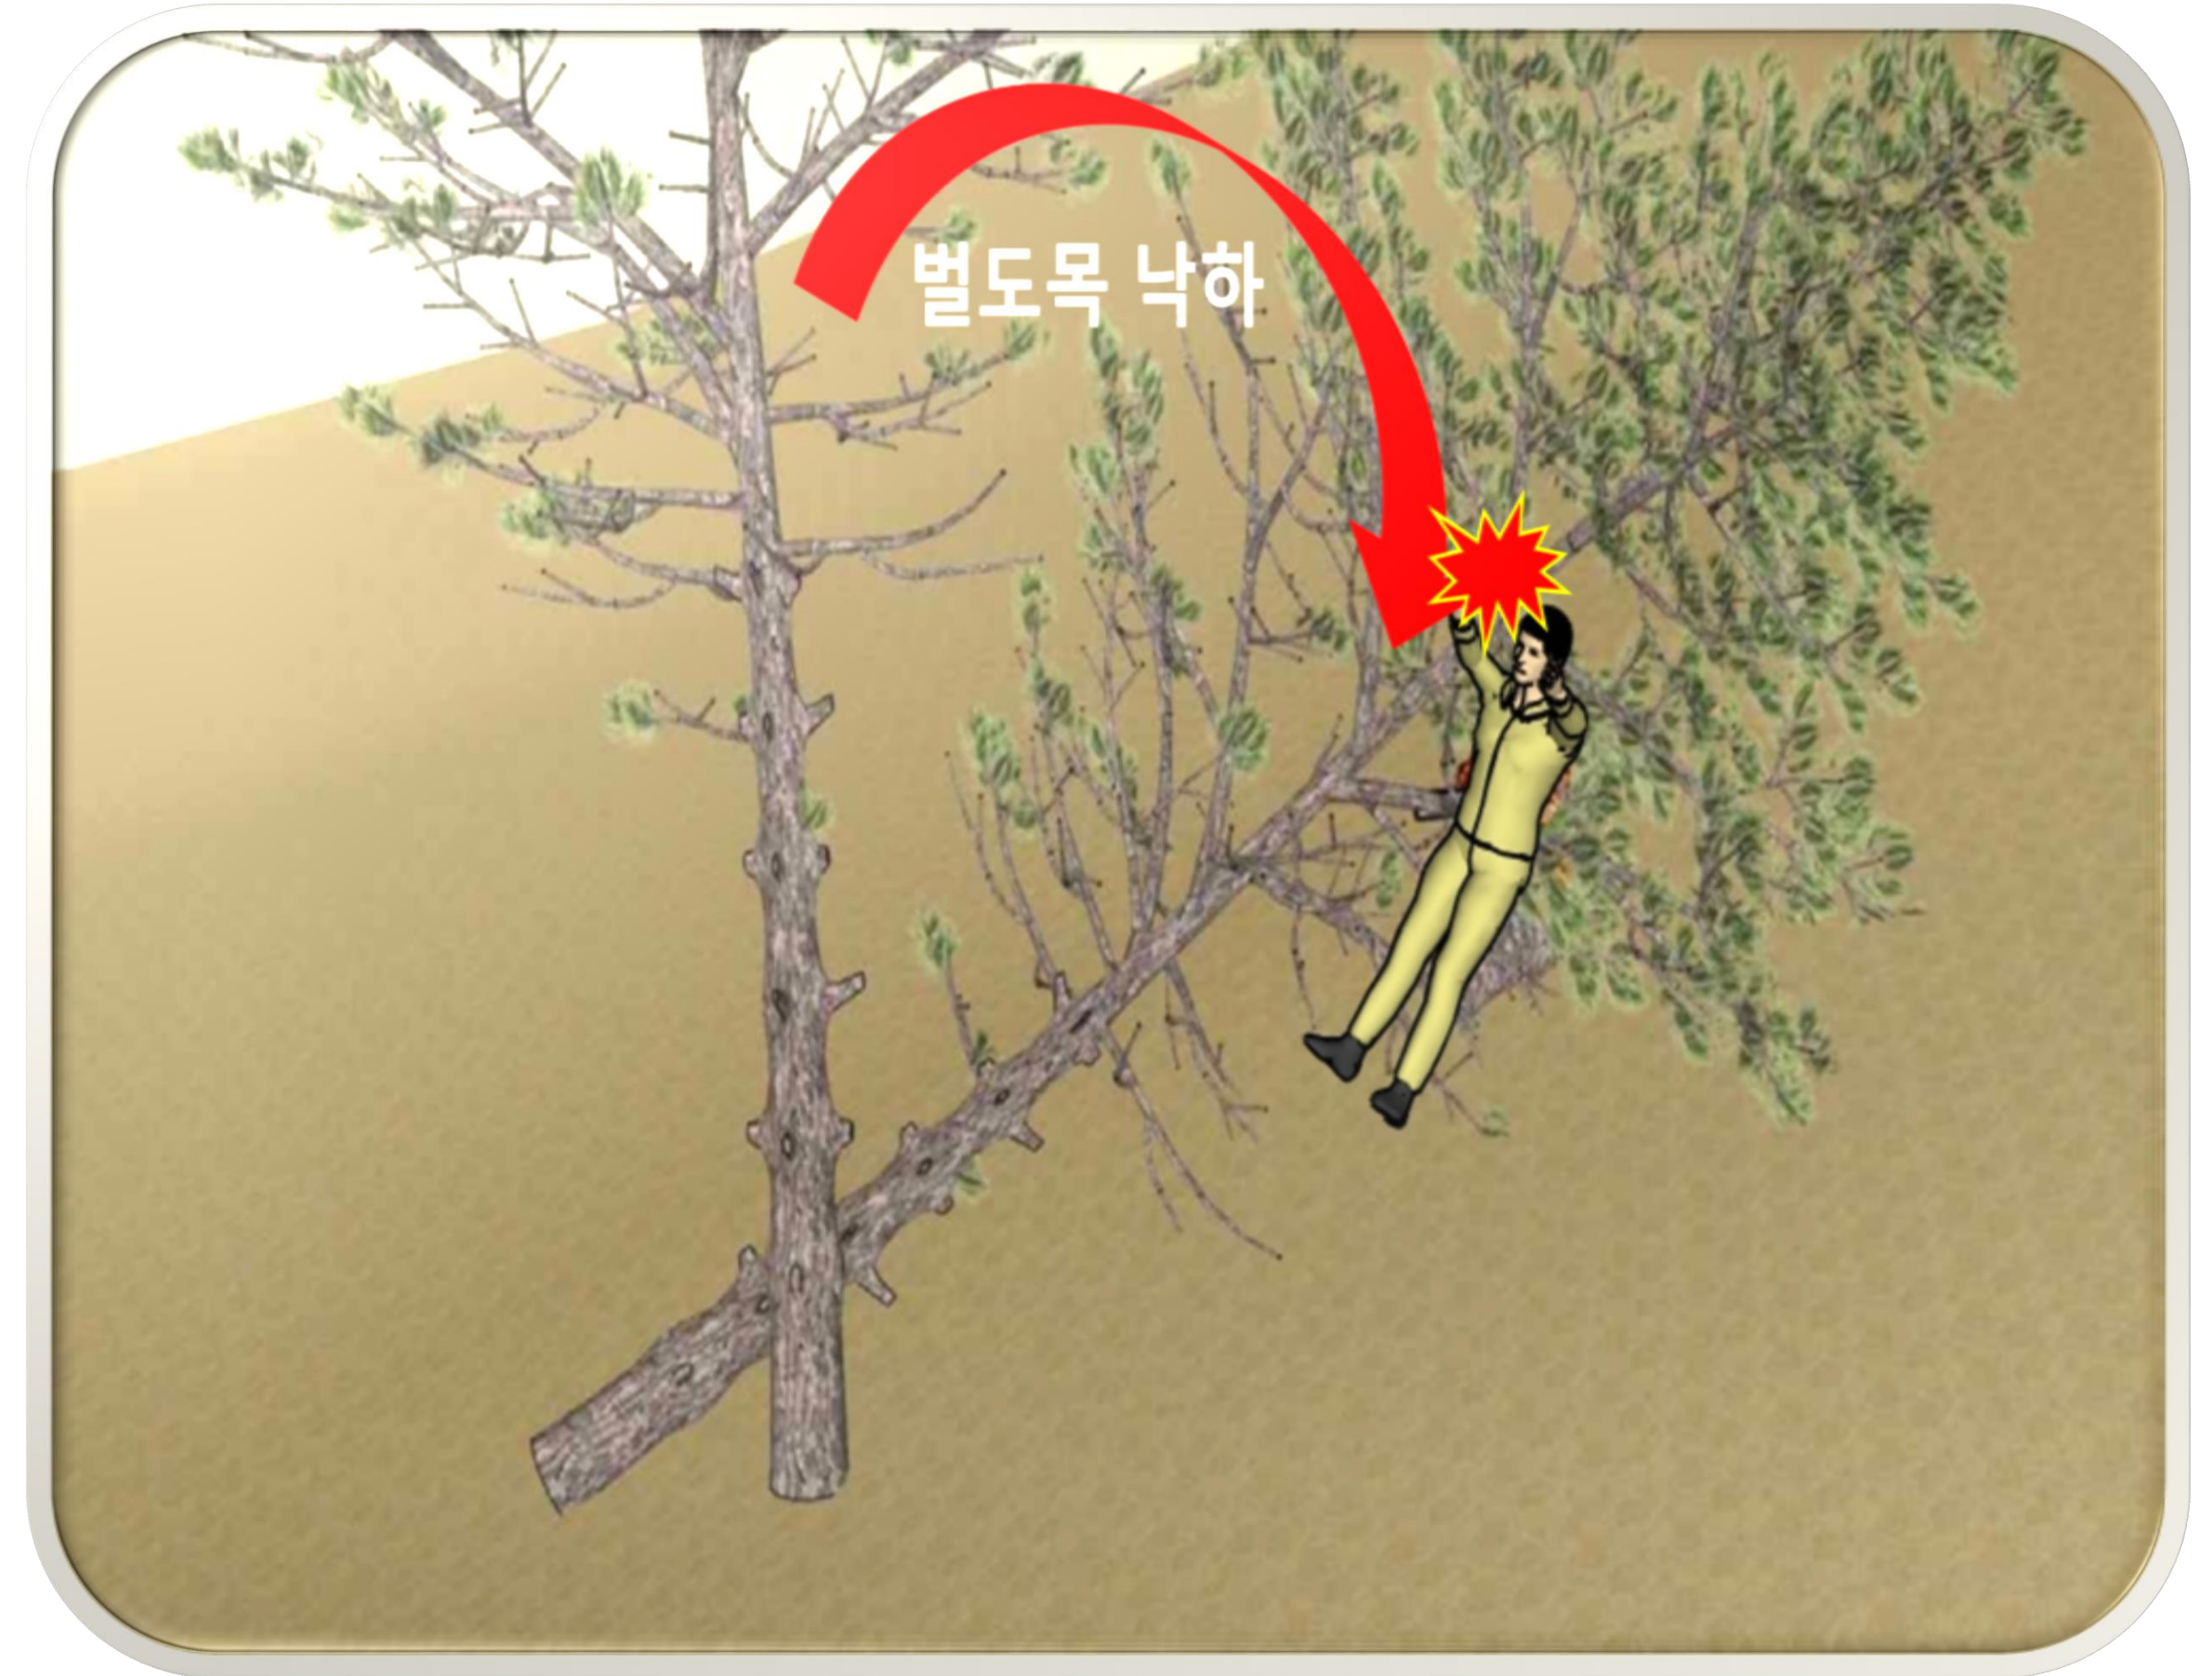


발생원인

① 전도 및 낙하방지조치 없이 벌도목 절단작업 실시

- 지장목에 걸린 나무는 하단부에서 밑동을 절단하는 중 전도 및 낙하의 위험이 있으므로 전도 및 낙하방지조치 등의 안전조치를 하여야 하나 미실시

② 중량물 취급작업에 대한 작업계획서 미작성

- 경사지에서 조재 작업을 하는 경우 중량물이 전도 및 낙하할 위험이 있으므로 위험에 방대책을 포함한 작업계획을 수립하여야 하나 미작성



예방대책

① 지장목에 걸린 나무를 안전하게 바닥에 떨어뜨린 후 조재 작업 실시

- 지장목에 걸린 나무 아래에서 작업 금지
- 벌도목이 지장목에 걸리게 되면 원치를 사용하거나 인력으로 잡아당겨 지장목을 바닥에 떨어뜨린 후 조재 작업 실시

② 중량물 취급 작업계획서 작성

- 경사지에서 조재 작업을 하는 등의 중량물을 취급하는 경우 전도 및 낙하 위험을 예방하기 위해 벌도목을 바닥에 떨어뜨리는 등 안전한 작업계획을 수립하고, 그 계획에 따라 작업이 진행될 수 있도록 작업관리 철저

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
