


⚠ 변압기 접촉 후 감전 되어 떨어짐 ⚠

재해개요

2025. 08. 00.(금) 07:40경 전북 완주군 소재
OOOO에서 전선 철거를 위한 준비 작업 중,
H변대 상부로 승강하여 COS와 변압기에 접촉
되어 감전 후 지상 바닥으로 떨어져 사망함.

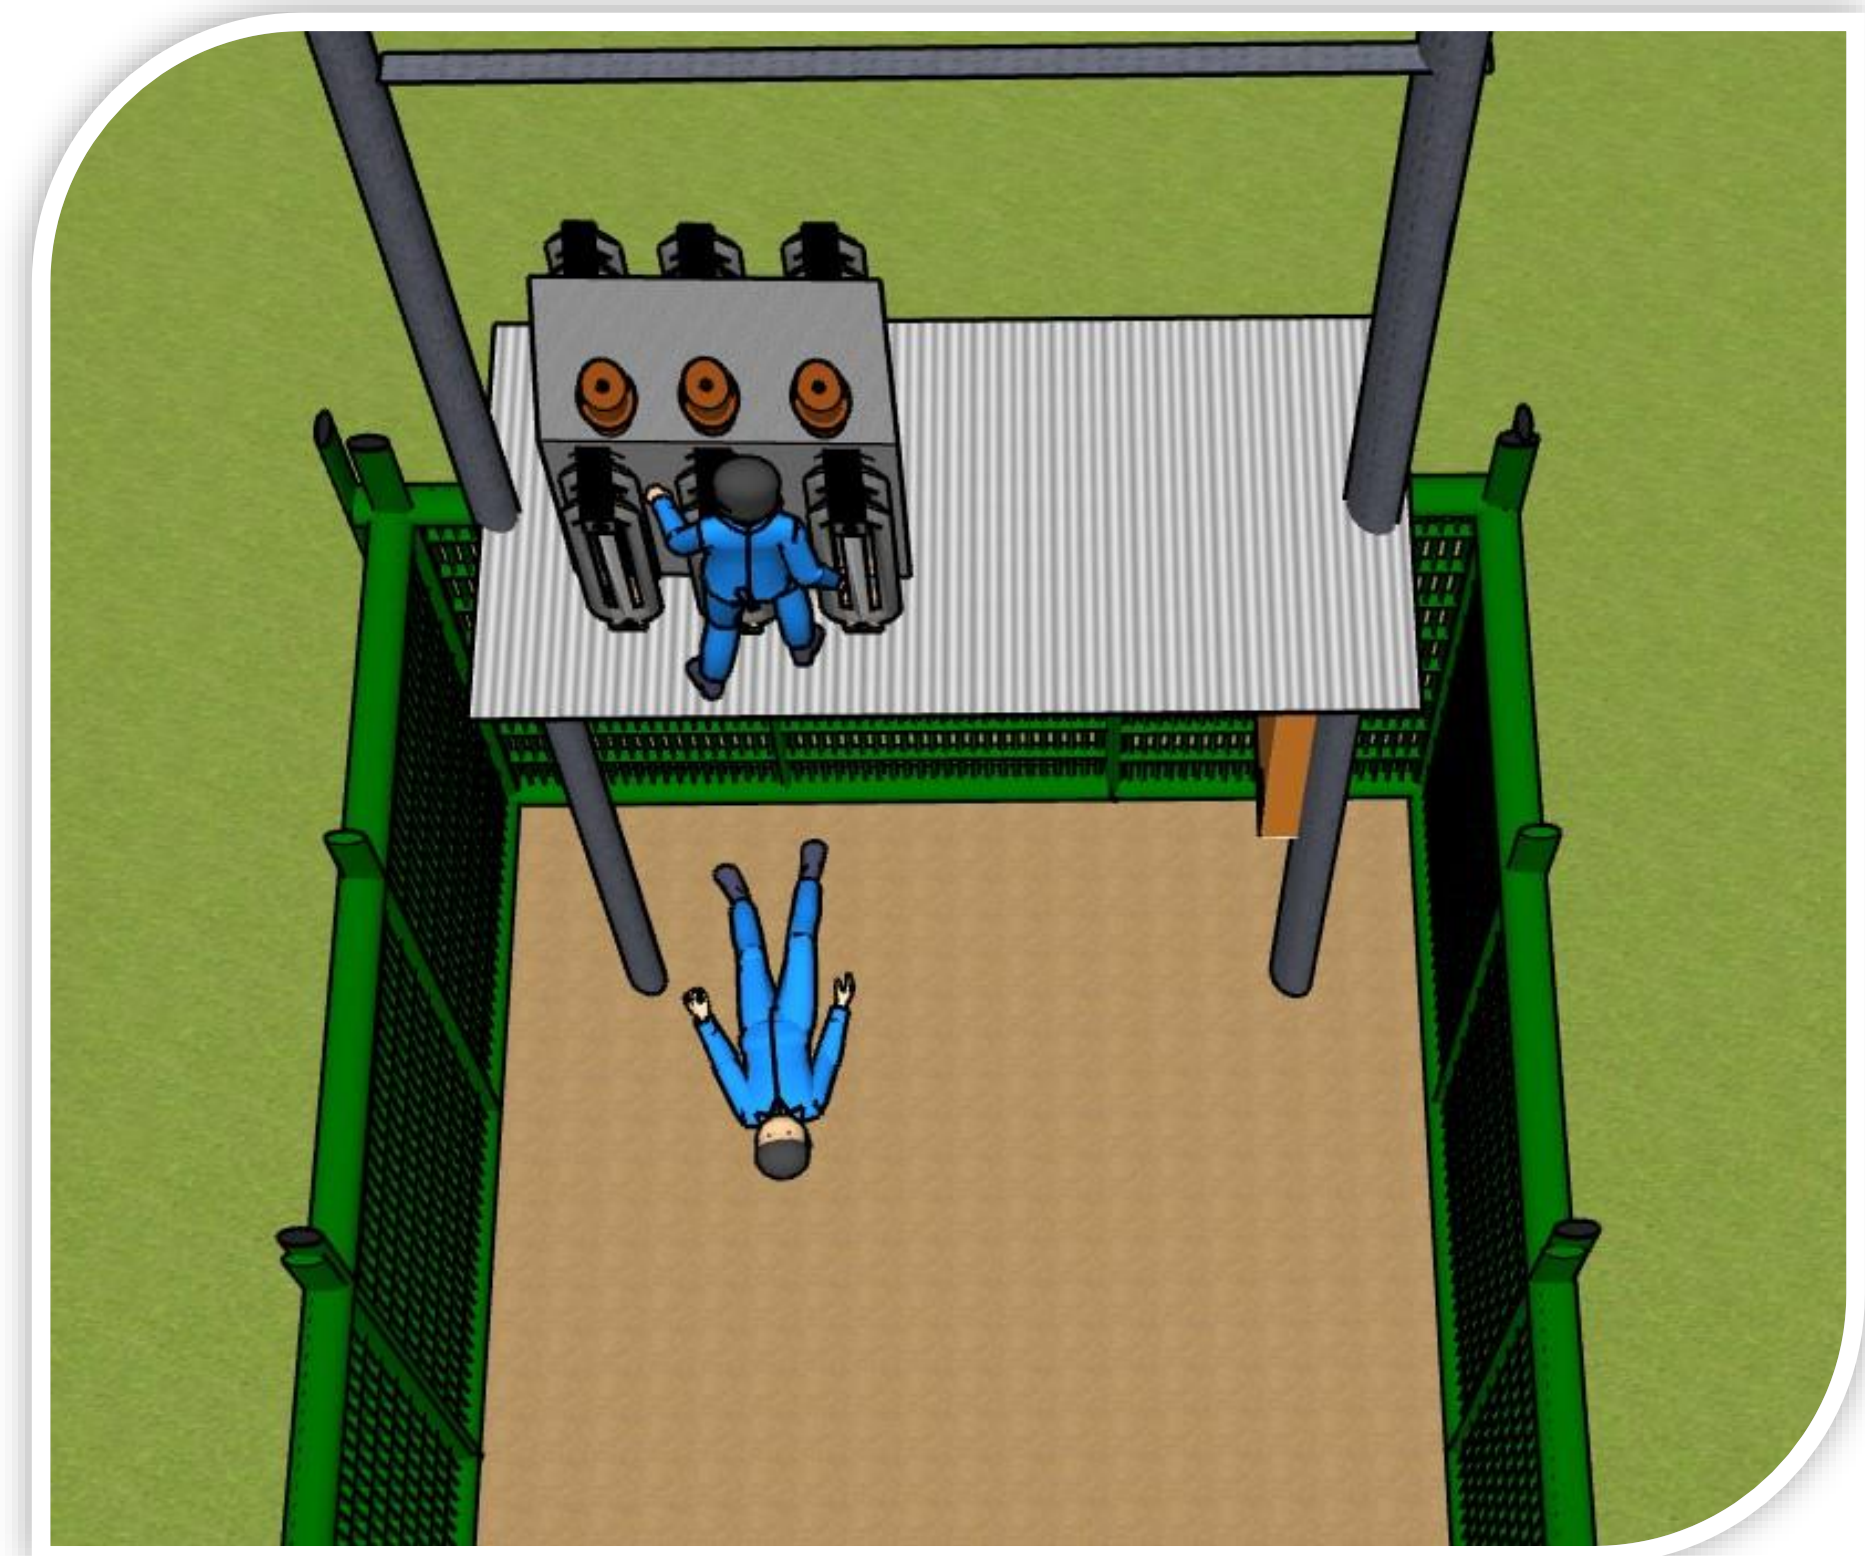

발생원인

▶ 감전 발생원인

- (전기 작업 시 정전 조치 미실시)
- 감전의 위험이 있는 H변대에 승강하기 전, 정전 조치 후 작업하여야 하나 미실시함.
- (특고압 충전부의 접근한계거리 미준수)
- 22.9kV의 특고압이 흐르는 변압기로부터 접근한계거리(0.9m)를 준수하여 작업하여야 하나, 접근한계거리 내에 접근하여 작업함.
- (절연용 보호구 미착용) 분전반 조작 시 절연용 보호구를 착용하여야 하나 미착용함.

예방대책

1 전기 작업 시 정전 조치 실시

- 특고압이 흐르는 설비에 접근하여 작업 시, 감전 및 아크로 인한 화상 등의 위험에 노출되지 않도록 정전 조치 후 접근 및 작업을 실시하여야 함.

2 H변대 시공 및 작업 시 안전수칙 준수

- H변대 작업발판 시공 시, 변압기 외함으로부터 0.7m 이상 떨어진 곳에 시공하도록 하여야 함.
- 점검 및 유지보수 등으로 작업발판 승강 시 전원 개방 후 작업하도록 하고, 활선작업이 불가피할 경우 전압 크기에 따른 접근한계거리 이내로 접근하지 않도록 작업공간 확보, 감시인 배치 실시.

3 절연용 보호구 지급 및 착용 관리 철저

- 전기의 접근 또는 접촉 가능성이 있거나 아크 발생 등 화상으로부터 보호하기 위한 절연용 보호구와 난연성 방염복을 지급하여 착용 지도를 철저히 관리하여야 함.

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
