






슬레이트 지붕 해체 작업중 떨어짐



재해개요

2025. 09. 05.(금) 10:40경 부천시 소재
부천공장 해체공사 현장에서 건물 슬레
이트 지붕 상부에서 이동하던 중,
슬레이트 지붕재를 밟아 파손되며 1층
바닥으로 떨어져 사망함

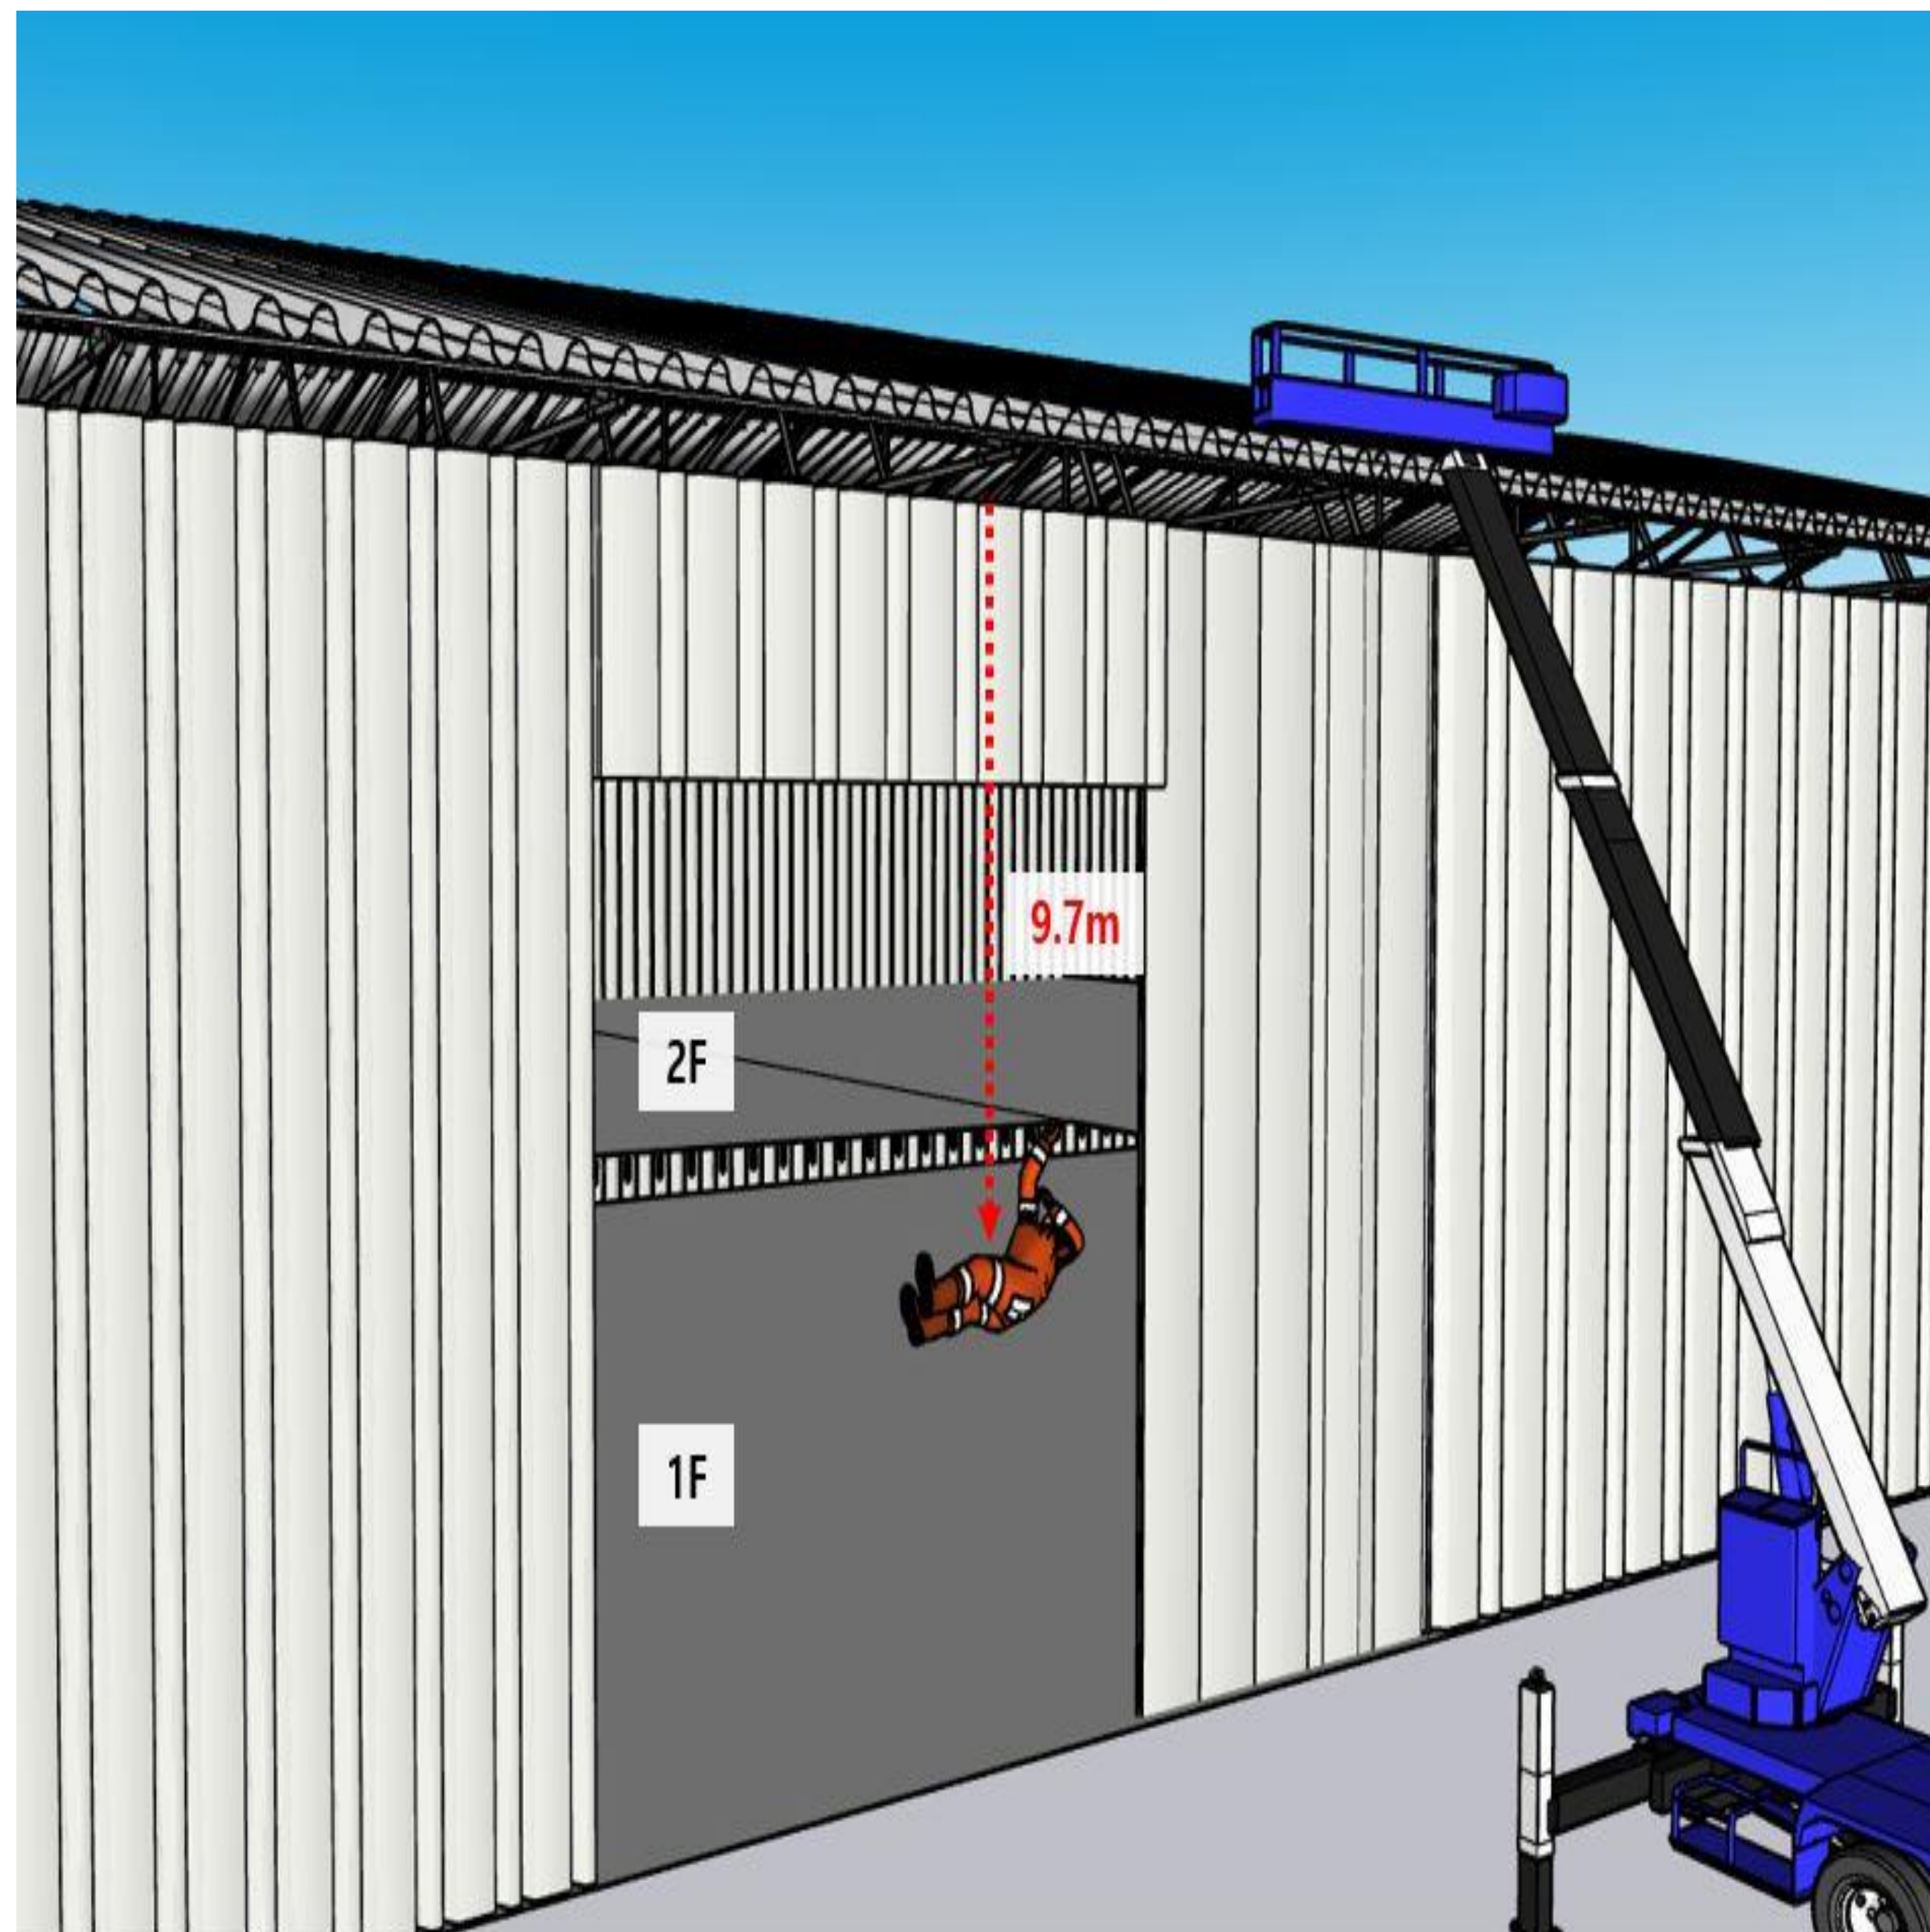

발생원인

▶ 지붕 위에서의 작업 시 추락 위험 방지조치 미실시

- (작업발판 미설치) 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30cm 이상의 발판을 설치하여야 하나 설치되지 않았음
- (추락방호망 미설치) 추락할 위험이 있는 지붕 위에서 작업하는 경우 추락방호망을 설치하여 추락 위험 방지 조치를 실시하여야 함



예방대책

1 작업발판 설치

- 슬레이트 및 섬유시멘트 판 등 파손되기 쉬운 재질로 된 지붕 위에서 작업하는 경우 폭 30cm 이상의 작업발판을 설치하여야 함

2 추락방호망 설치

- 추락할 위험이 있는 지붕 위에서 작업하는 경우 추락방호망을 설치하여 추락 위험 방지 조치를 실시하여야 함

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
