





승강기 부품 교체 공사 작업 중 떨어짐



재해개요

2025. 05. 00.(화) 15:30경 서울 서초구 소재

○○○현장에서, 재해자가 승강기 부품 교체 공사를 위해 균형추 상부와 지상 2층 바닥에 수평으로 걸쳐놓은 사다리 상부 이동 중 균형추를 지지 하던 파이프 서포트가 좌굴 후 파단되어 균형추와 사다리가 하강하며 재해자가 바닥으로 떨어짐

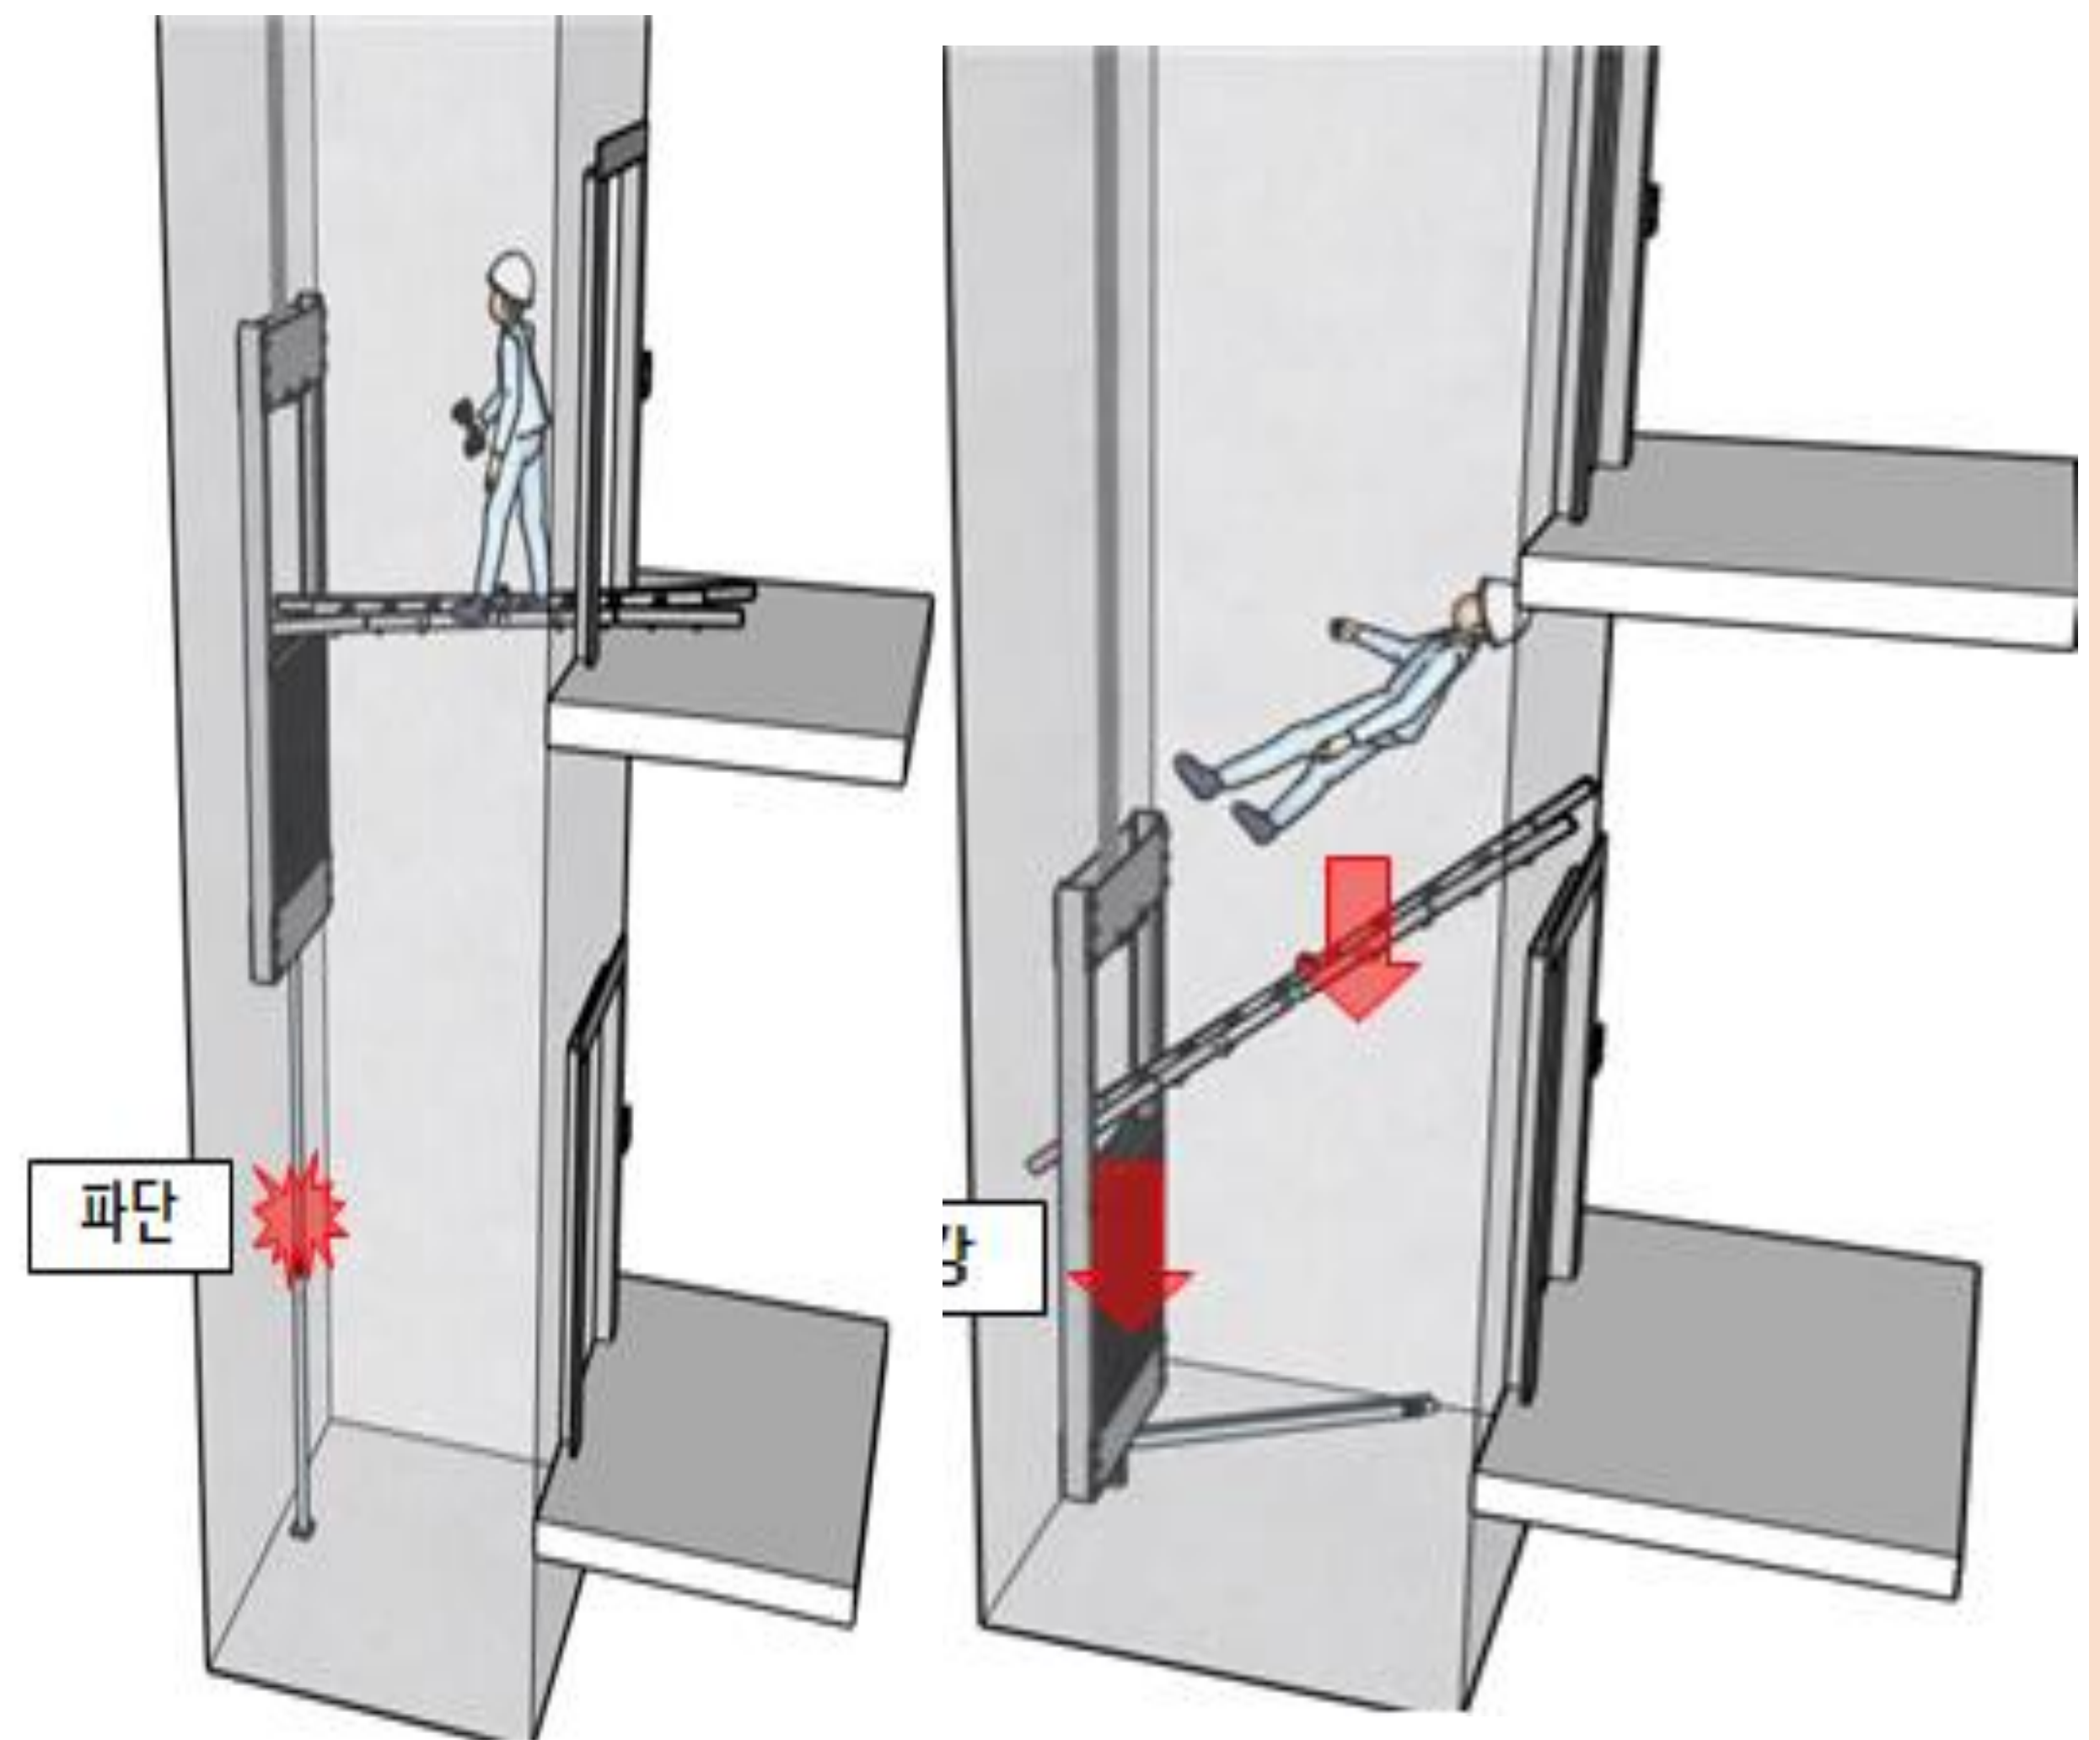


발생원인

▶ 작업 발판 설치 미흡

- 고소 작업에 대해 비계 등의 작업 발판을 설치하지 않고 사다리를 얹혀 사용하는 등 작업 발판 설치 상태가 미흡하여 떨어짐 재해 발생

▶ 안전대 부착 설비 미설치

- 사다리 상부에서 이동 및 작업을 하기 위해 근로자가 체결할 수 있는 안전대 부착 설비를 설치하지 않아 떨어짐 재해 발생



예방대책

1 고소작업 시 작업 발판 설치

- 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 비계 등의 작업 발판을 설치하고 안전난간을 설치할것

2 추락방지조치 철저

- 근로자가 작업 및 이동 중 추락할 위험이 있는 경우 근로자에게 안전대를 착용하게 하고 안전대를 체결할 수 있는 안전대 부착설비를 설치할 것.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
