






# 철판 설치 작업 중 추락



## 재해개요

2025. 11. 00.(화) 11:17경 강원도 인제군 소재 000 공사현장에서 재해자가 철골 구조물 상부에서 철판 설치 작업을 하던 중, 철판을 고정한 클램프가 이탈하면서 중심을 잃고 바닥으로 떨어져 사망함.

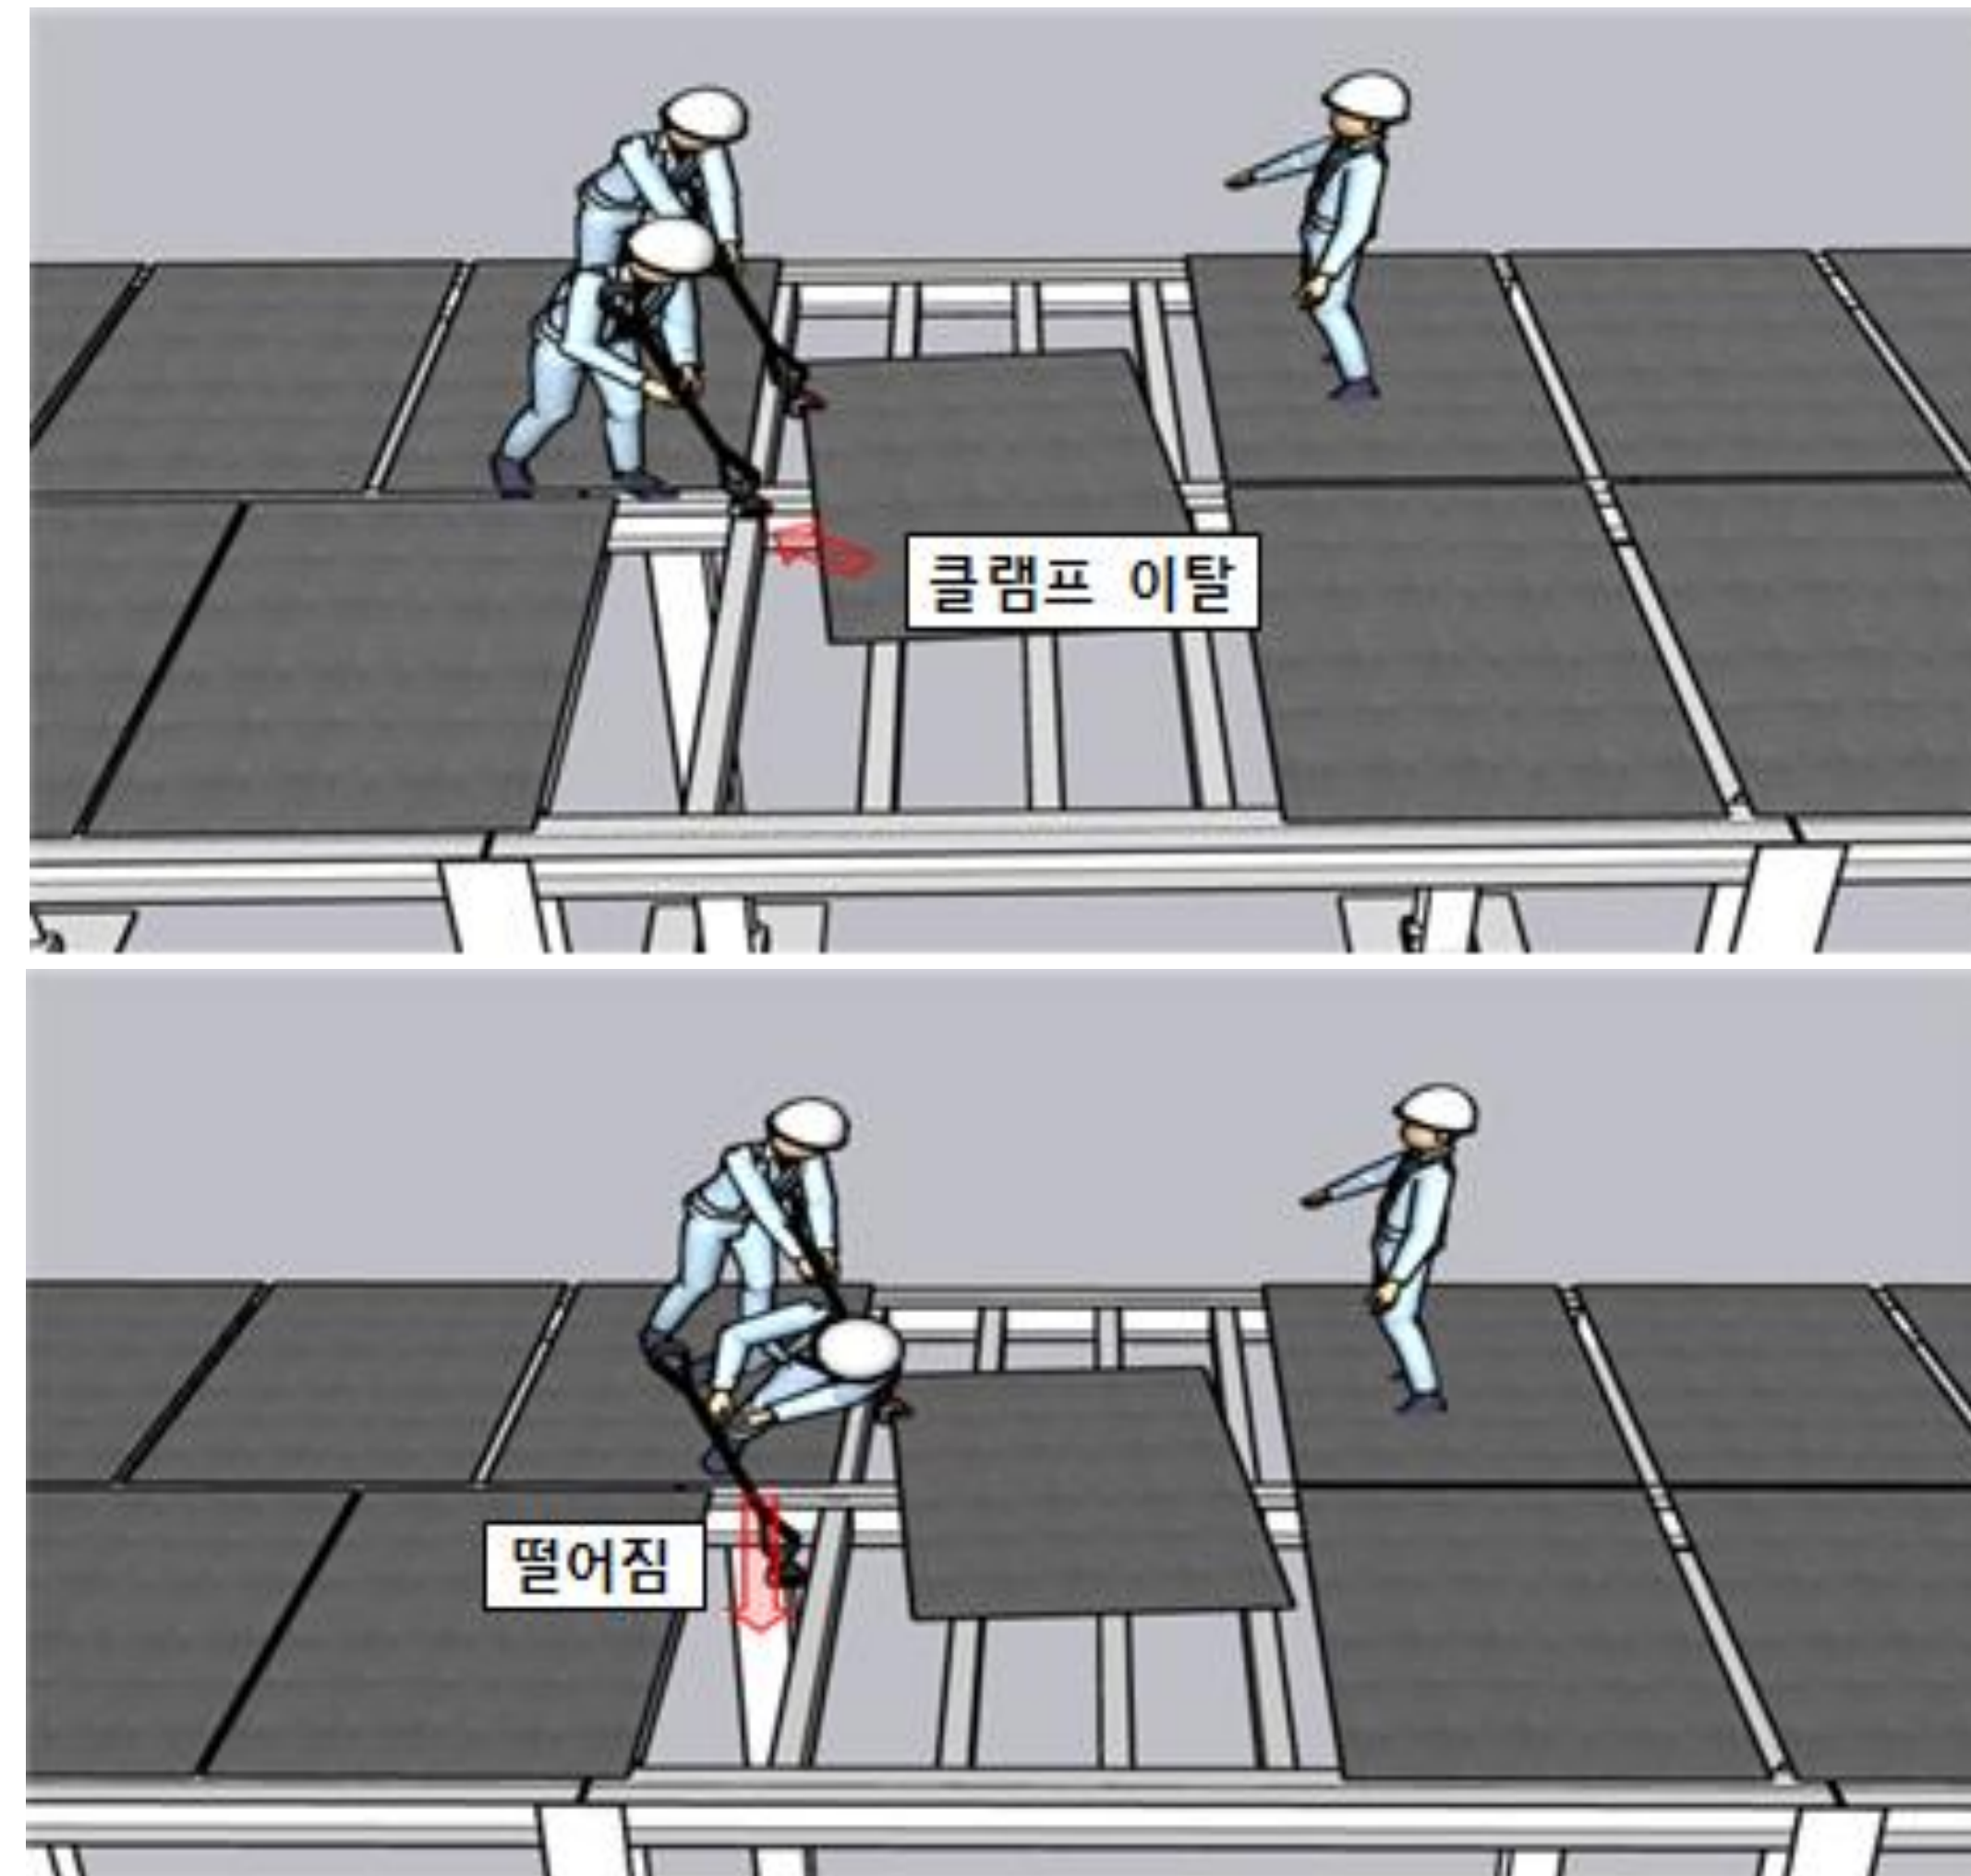

## 발생원인

### ▶ 추락재해 발생 원인

#### - (추락 방호망 미설치)

철골 프레임 설치에 따라 개구부가 다수 발생하였으나 프레임 하부에 추락방호망 미설치

#### - (안전대 부착설비 미설치)

높이 약 5.5m의 철골 프레임 상부에서 근로자 작업 또는 이동 중 개구부 및 단부에 떨어질 위험이 있으나 안전대 부착설비 미설치



## 예방대책

### 1 추락방지조치 실시

- 근로자가 작업 중 철골 프레임 개구부 및 단부로 떨어질 위험을 예방하기 위해 추락방호망 설치, 안전대 부착설비 등의 추락방지조치를 실시하고 작업자가 안전대를 체결 후 작업할 것

### 2 중량물 취급작업 계획서 작성 및 이행

- 철판 이동 및 설치에 대한 추락, 낙하, 전도, 협착, 붕괴 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 수립하여 그 작업 계획에 따라 작업하도록 하고, 작업지휘자를 지정하여 이를 지도·감독할 것

### 3 중량물(철판)의 이동방법 개선

- 철판 운반 시 클램프 이탈 가능성이 있어 작업 중 클램프 사용에 대한 근로자 교육을 강화하고, 대각선 방향으로 당겨도 클램프가 이탈하지 않도록 나사 고정 방식의 클램프 사용을 고안하는 등 현장에 맞는 작업 방법으로 철판을 운반하도록 할 것

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
