






타워크레인 해체작업 중 추락



재해개요


2024. 11.00.(목) 00:00경 인천시 소재 근린생활시설
건설현장에서 타워크레인 해체작업을 위해,
지상 9층 발코니에서 브레이싱 고정볼트 해체 작업
중 작업 위치를 옮기는 과정에서 중심을 잃고 지상
2층 바닥으로 추락하여 사망함

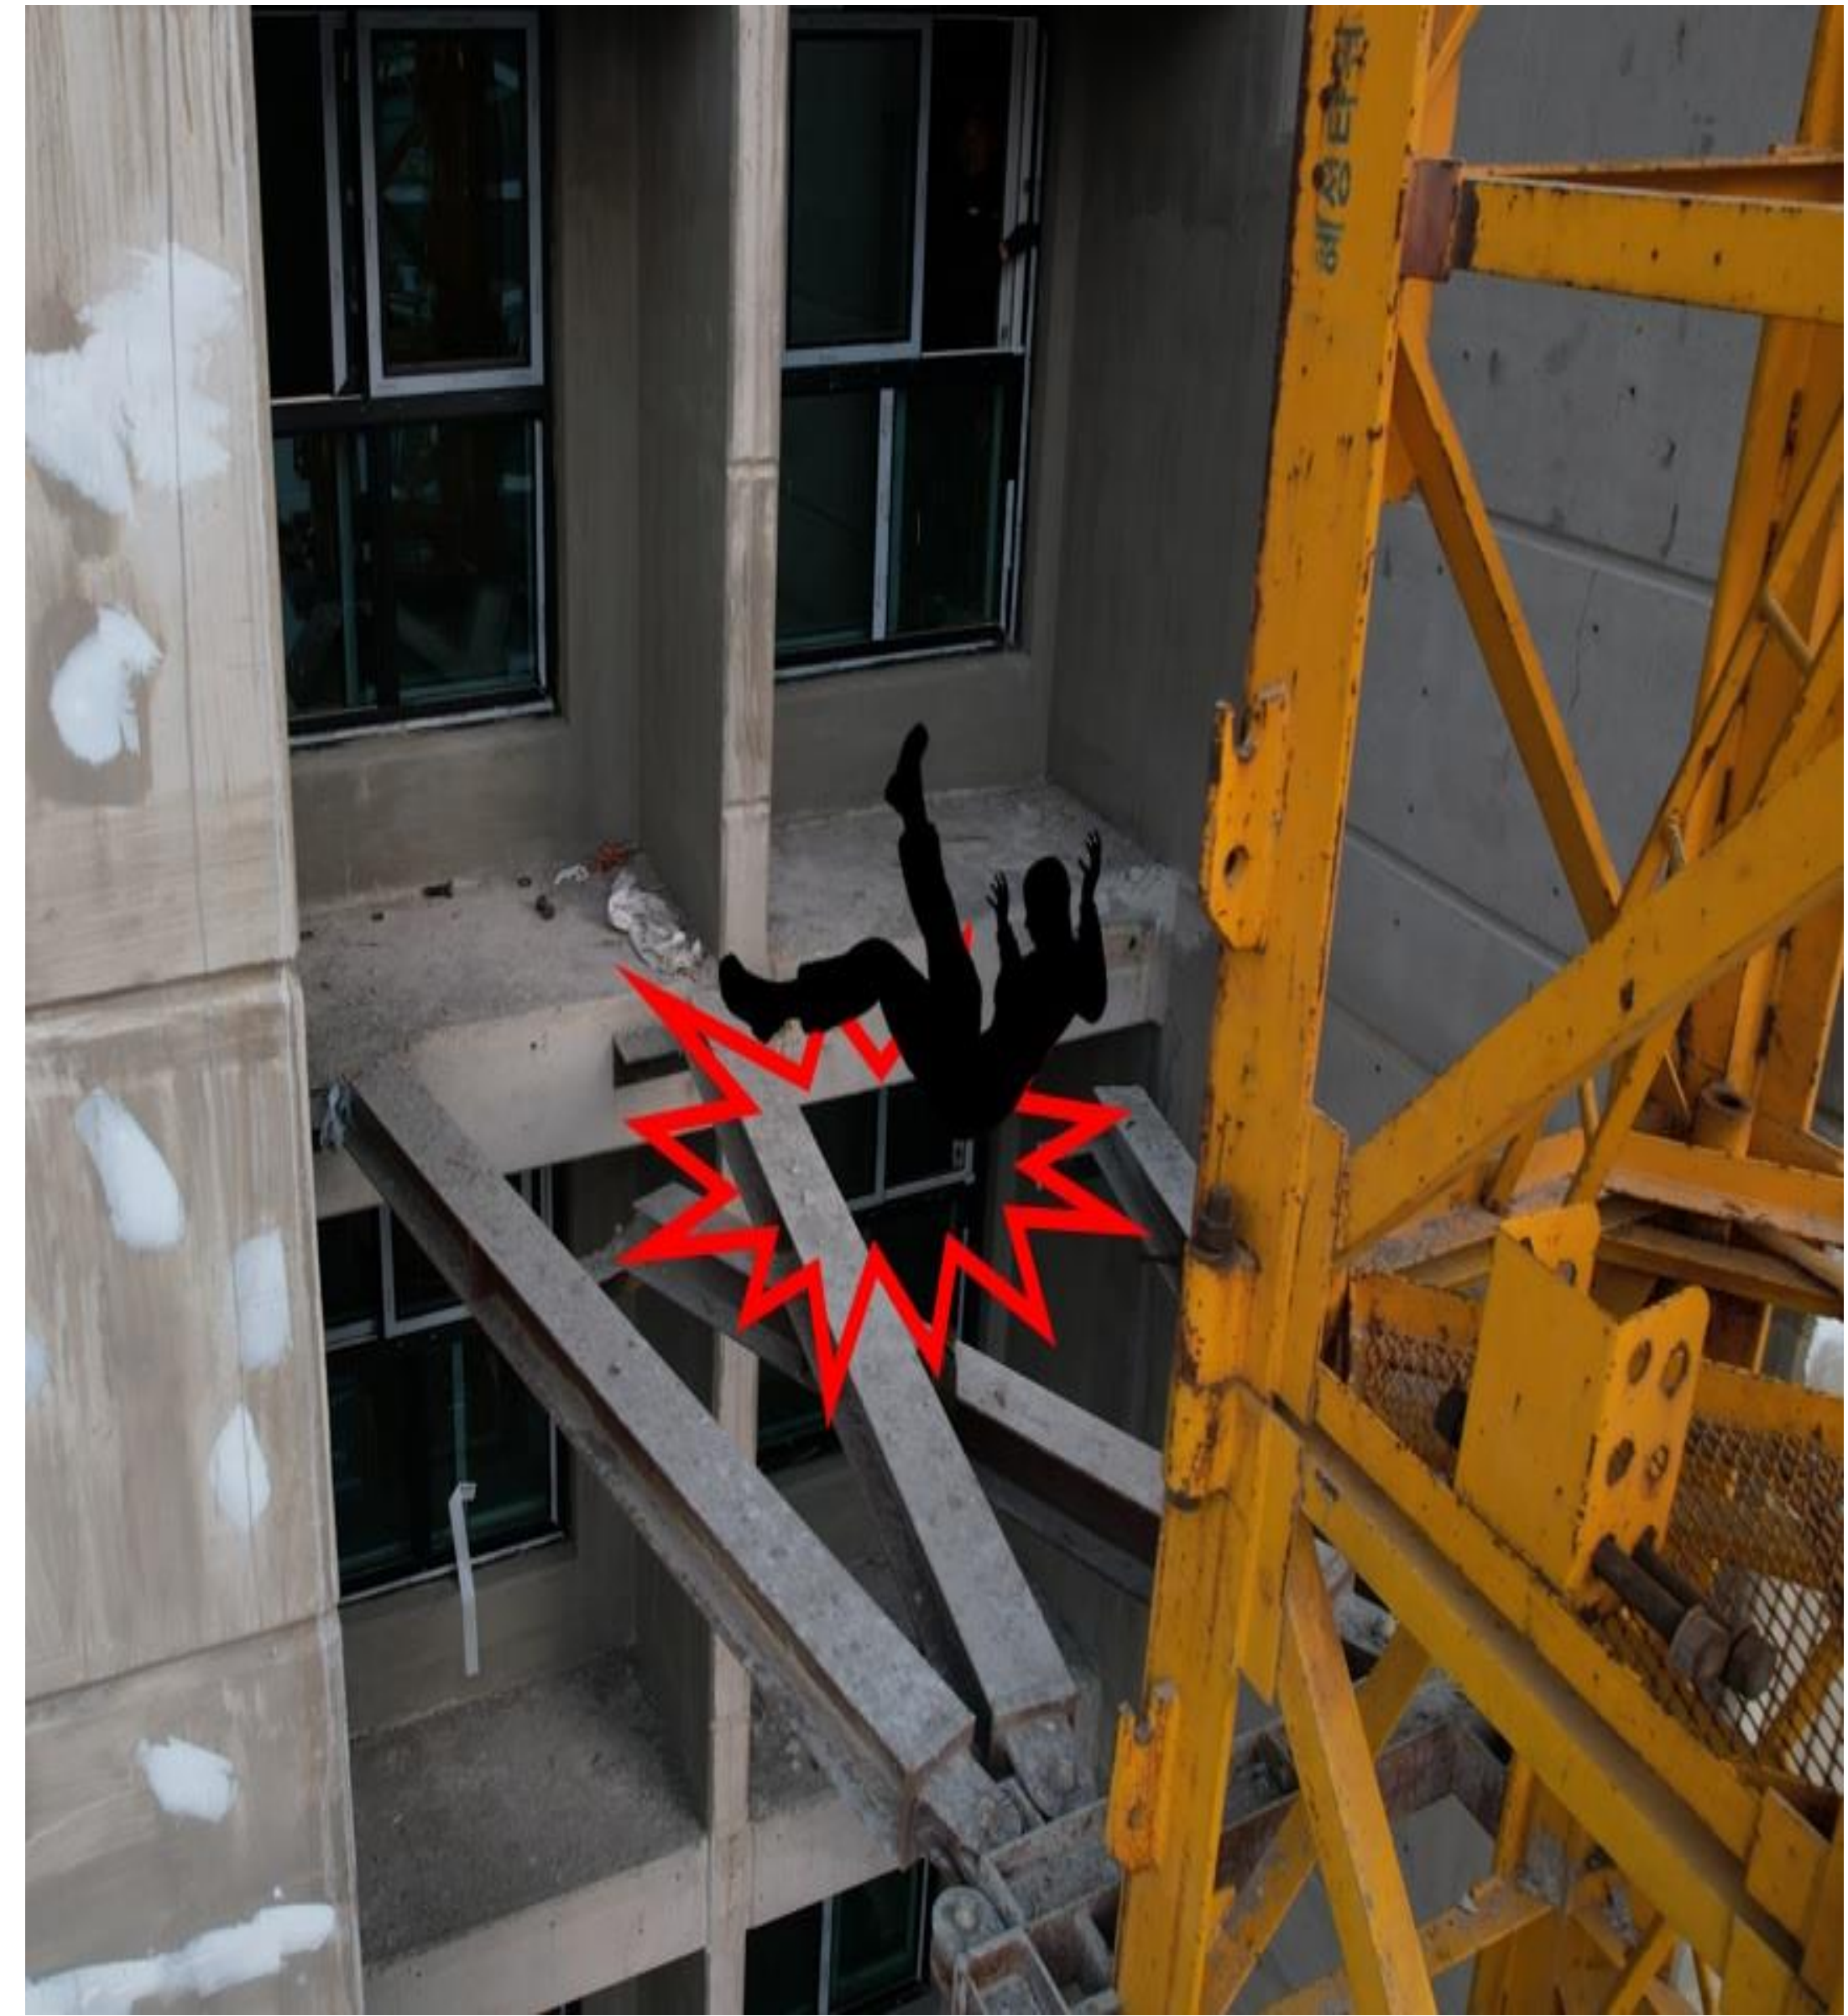

발생원인

▶ 추락 방호 조치 상태 불량

- (안전 난간) 재해발생 지점인 발코니에 추락의 위험이 있음에도 안전 난간이 설치되어 있지 않았음
- (추락 방호망) 타워크레인 주변으로는 작업 시 간섭이 되어 추락 방호망이 설치되어 있지 않았음
- (안전대 부착설비) 재해발생 지점인 발코니에는 안전대 고리를 걸 수 있는 별도의 안전대 부착설비가 설치되어 있지 않았음



예방대책

① 추락 방호 조치 철저

- 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전하게 작업할 수 있도록 안전 난간 혹은 추락 방호망을 설치하여야 함
- 설치하기 어려운 경우, 근로자가 안전대 고리를 걸 수 있는 안전대 부착설비를 설치하여야 함

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
