


⚠️ 천장크레인 해체 중 낙하물에 맞음 ⚠️

🚧 재해개요

2025. 05. 00.(수) 15:27경 울산 울주군에 소재한
OO철거공사 현장에서 천장크레인을 철거하던 중,
레일이 완전히 절단되지 않은 상태로 해체 작업을
진행하던 과정에서 분리하려던 레일과 연결된
다른 레일이 함께 낙하(4.5M)하며 반동하였고,
그 여파로 하부에 있던 재해자를 타격함

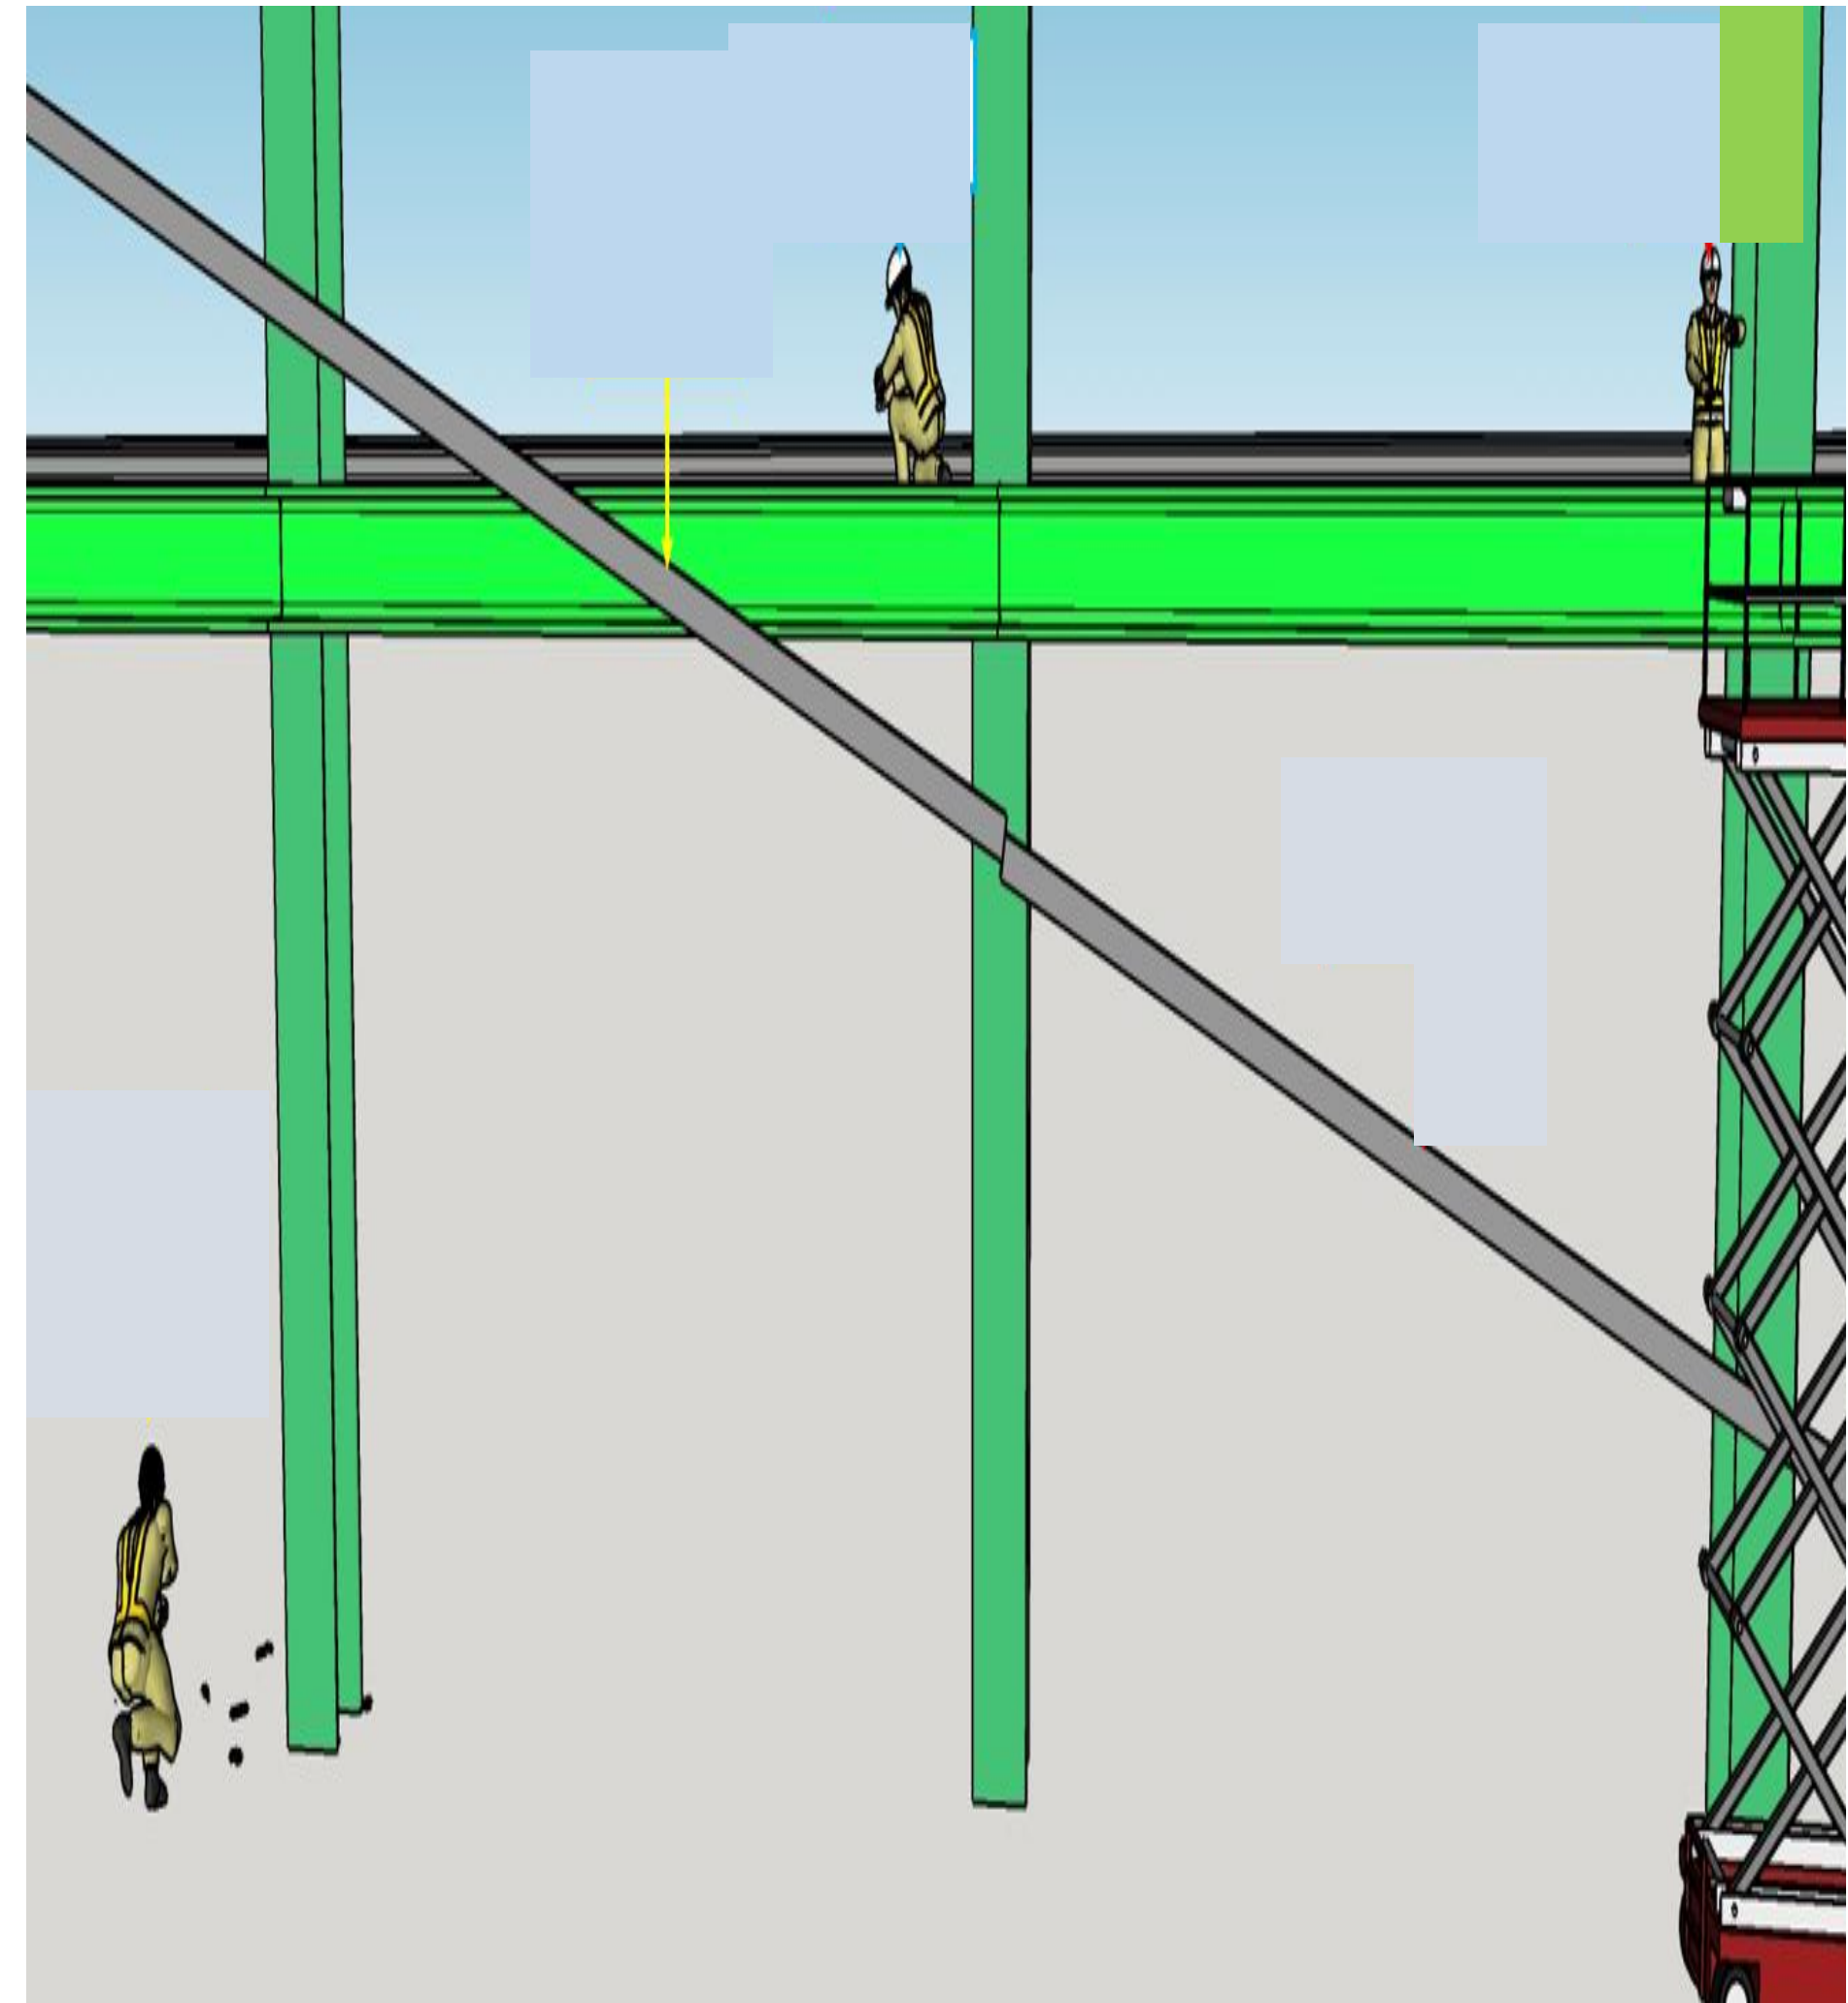

📝 발생원인

▶ 중량물 취급 작업계획서 미작성

- 작업 전 작업 방법 및 순서, 인양 방법, 작업지휘자 및 신호수 등 안전 작업을 위한 작업계획 미수립

▶ 인양작업 시 인양물 하부 등 출입통제 미실시

- 작업자가 위험지역에 위치하지 않도록 작업 지휘 및 출입 통제를 미실시

▶ 고소작업대를 목적 외의 용도로 사용

- 사람 또는 공구·자재를 작업 위치로 이동시키는 것이 아닌, 레일을 하역하는 용도로 사용

👷 예방대책

❶ 작업 전 중량물 취급 작업계획서 작성 및 적절한 작업장비 선정

- 중량물 취급 작업 시 사전에 작업계획서를 작성하여 작업방법 및 순서를 결정하고 안전대책을 수립
- 취급대상의 형태에 적합한 양중기를 선정하고 줄걸이 방법 등을 사전에 검토

❷ 인양작업 시 인양물 하부 등 작업반경 내 근로자 출입금지 조치 철저

- 작업계획서에 따라 작업지휘자와 신호수를 배치하여 작업상황 관리 및 작업반경 하부의 작업상황 통제
- 작업 간 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않게 조치

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다
