




개구부 덮개 상부에서 작업 중 떨어짐



재해개요

2025. 09. 00.(금) 07:40경 전라북도



익산시 소재 0000에서 장비반입구(개구부)

격실 내 물품 반출작업 중 부식된 상태의

장비반입구(개구부) 덮개가 파손되면서 덮개

상부에 위치한 근로자 2명이 지하층으로


(H≒4.45m)으로 떨어진 재해임.

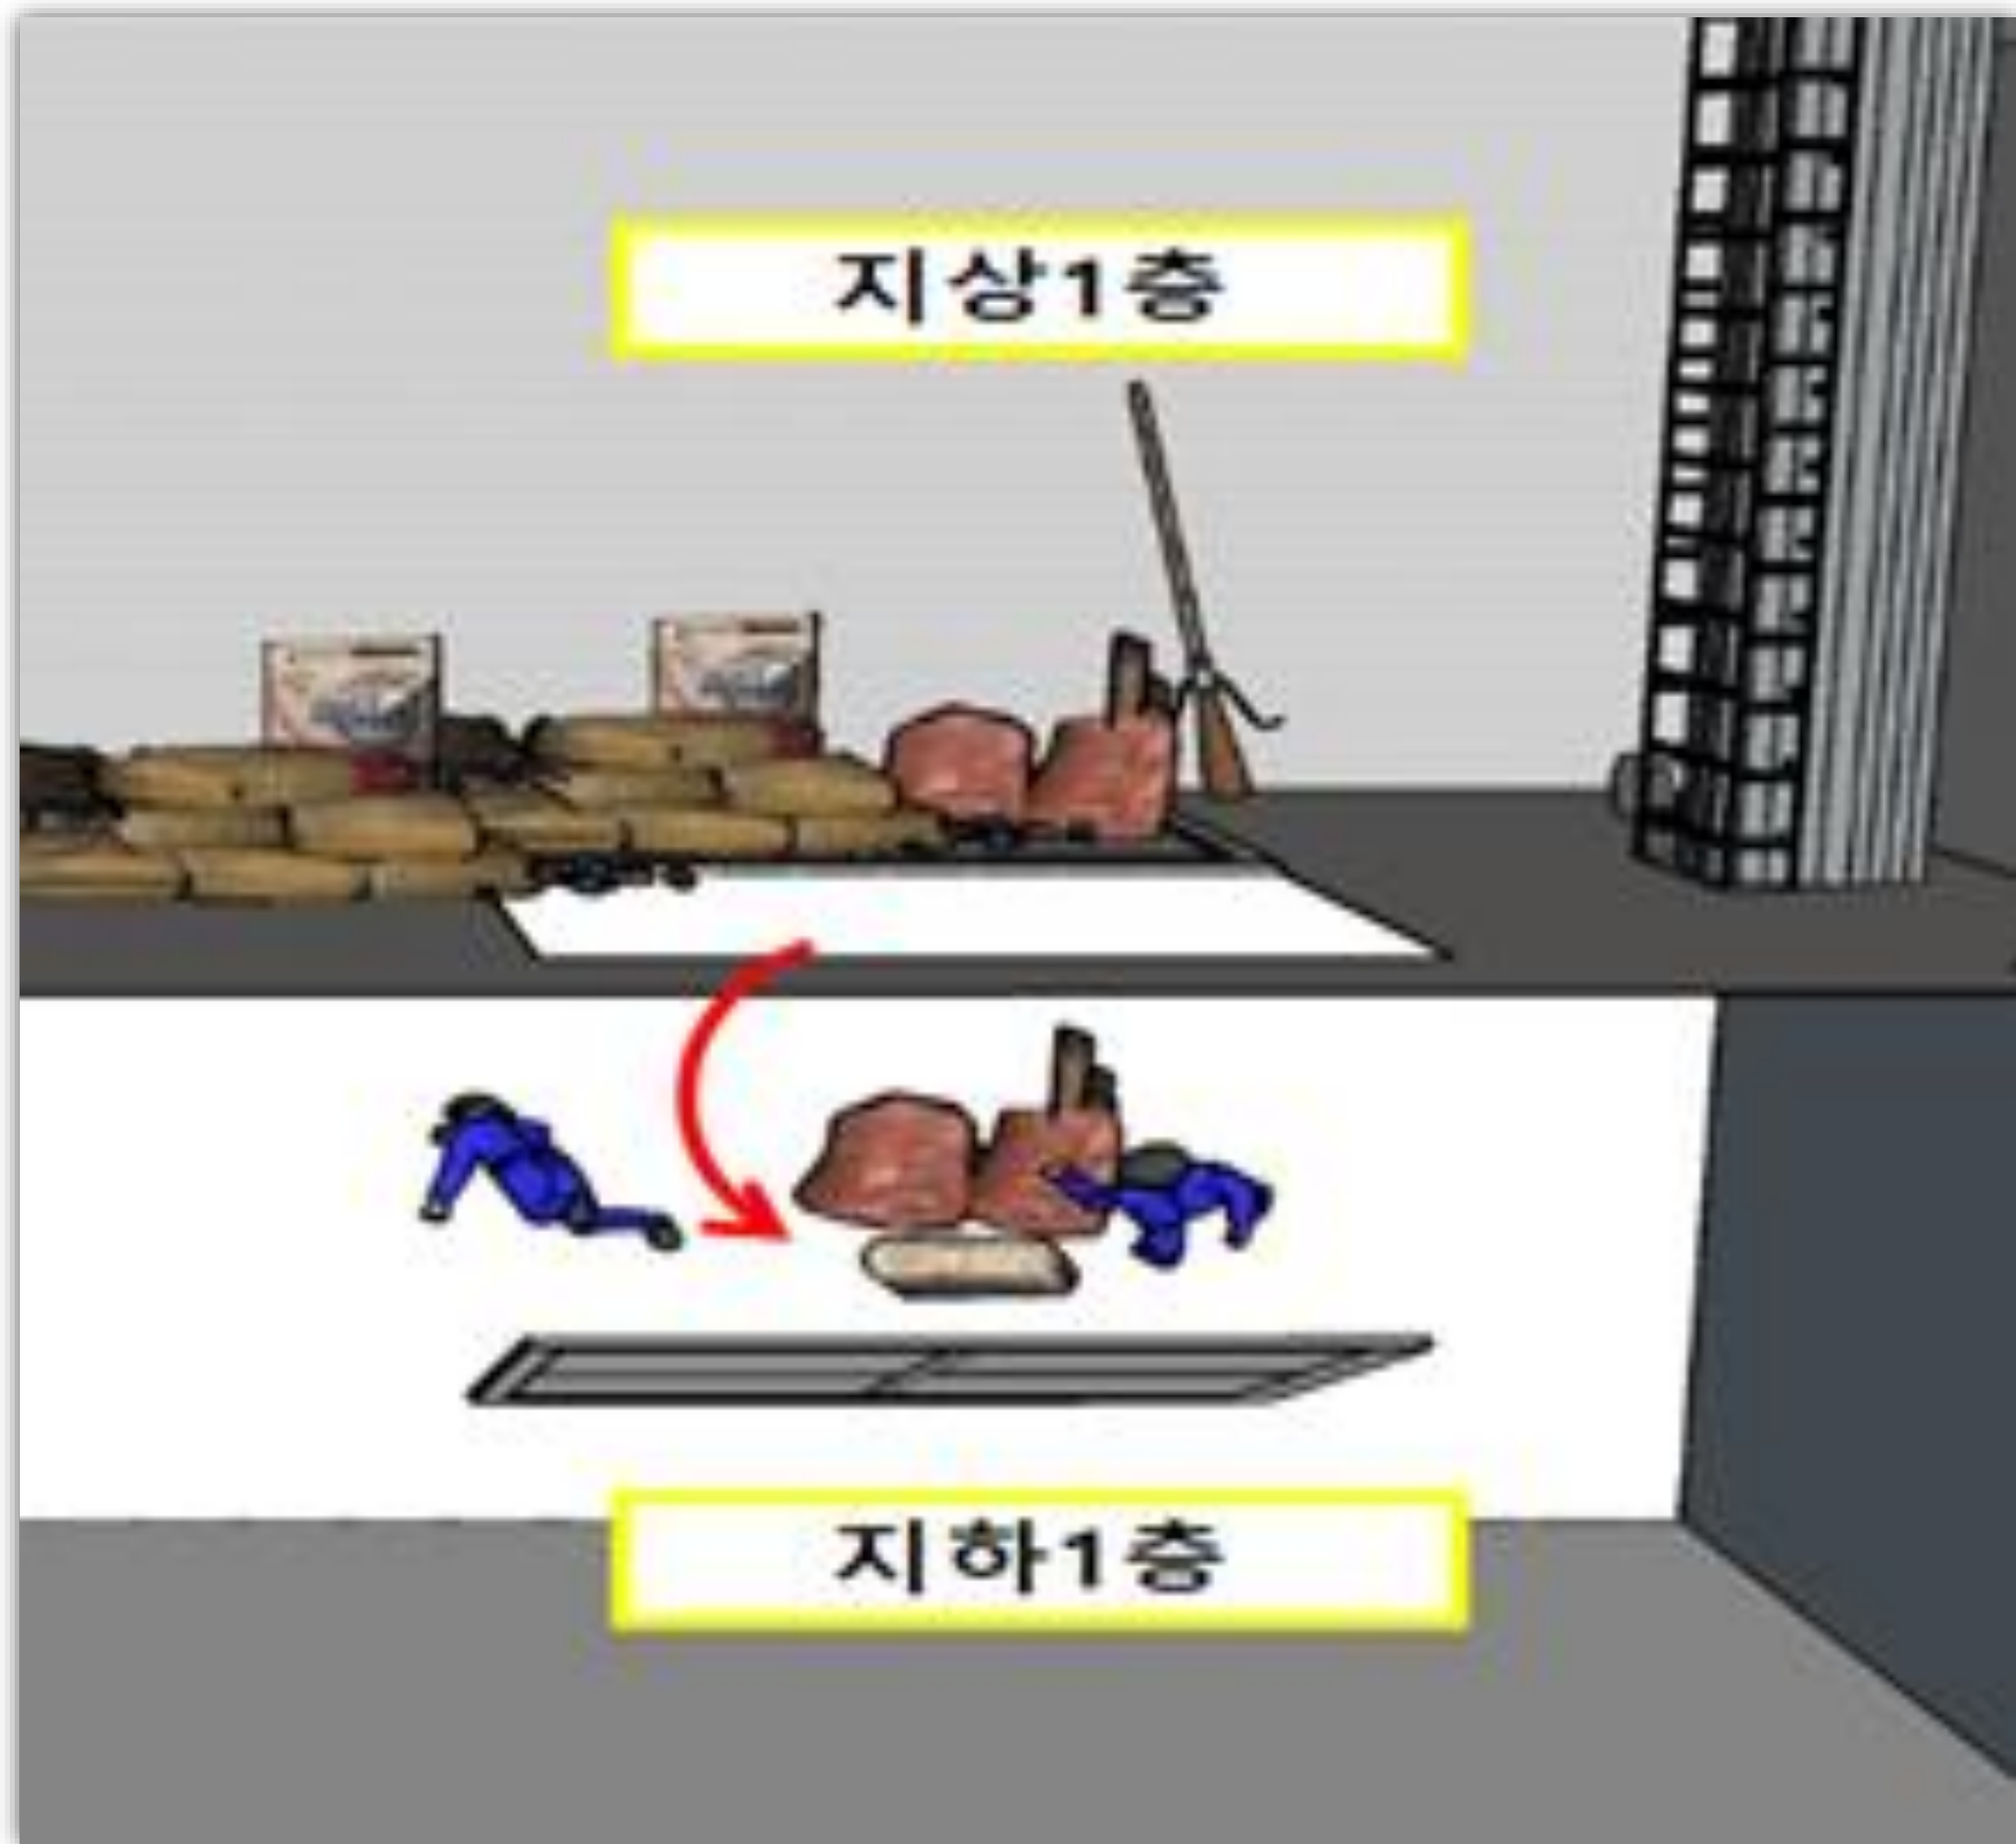

발생원인

▶ 추락 발생원인

- (개구부 방호조치 미흡) 개구부 인근 구역에서 근로자가 작업 시 개구부로 떨어짐 방지를 위하여 충분한 강도를 가진 구조로 덮개 등이 설치되어야 하나 재해 당시 설치된 개구부 덮개는 부식으로 인해 파손되어 추락 위험이 있었음.
- (개인보호구 미착용) 바닥 개구부가 설치되어 떨어질 위험이 있는 작업 중 안전모, 안전대 등을 착용하지 않은 상태로 작업을 수행함.



예방대책

① 개구부 방호조치 실시

- 개구부(장비반입구) 인근 구역 작업시 근로자가 개구부로 떨어지는 것을 방지하기 위해 개구부 덮개를 견고하게 설치하고 충분한 강도를 유지해야 하며,
- 근로자가 개구부임을 인지할 수 있도록, 개구부 표시를 실시해야함.

② 개인보호구 착용

- 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 실시하는 경우 안전모, 안전대 등 개인보호구를 착용하고 작업해야 함.

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
