






시스템 비계 해체 작업 중 떨어짐



재해개요

2025. 7. 00.(월) 14:20경 강원 동해시 소재
○○○현장에서, 재해자가 시스템비계 해체
작업 중 작업 발판에서 떨어져 사망함

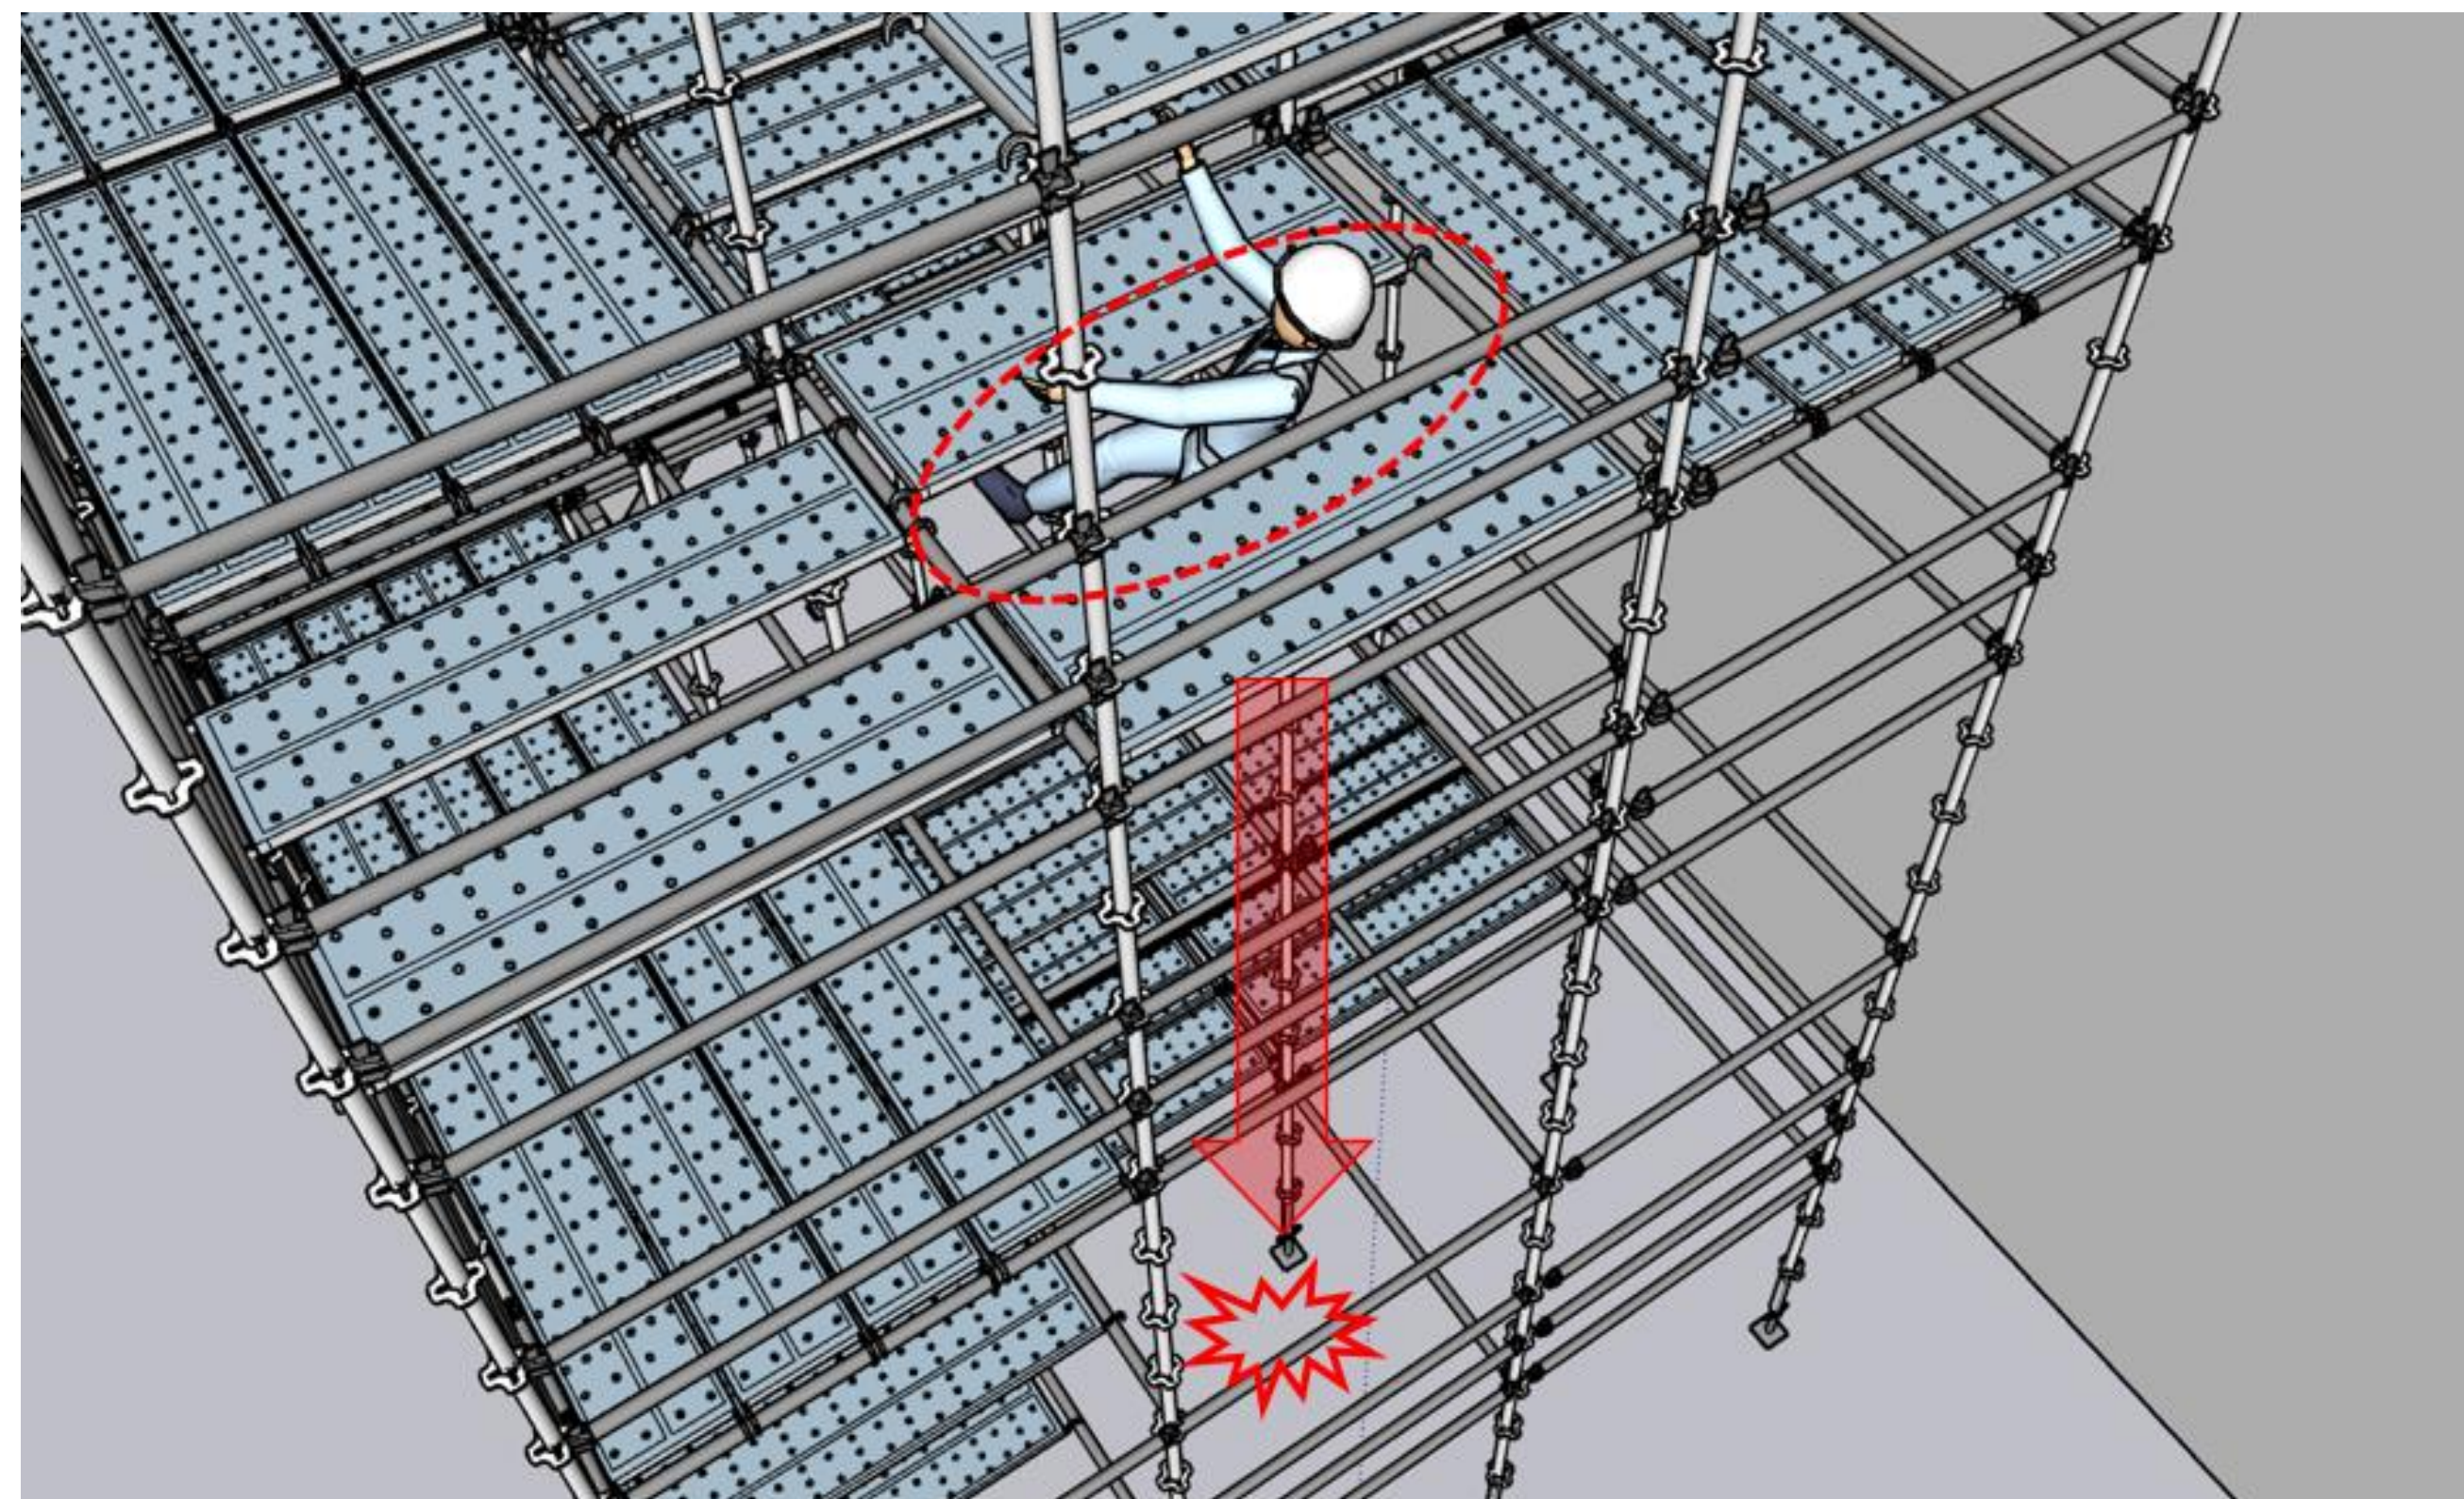

발생원인

- ▶ 추락 위험 구간에서 작업 중 안전대 미체결
 - 시스템비계 4단 작업 발판이 일부 미설치되어 개구부가 발생한 상태에서 5단 작업 발판 해체 및 4단 작업 발판 재설치 작업 중 안전대를 체결하지 않아 재해가 발생함



예방대책

- 1 시스템비계 해체 작업 시 추락 방지 조치 실시
 - 시스템비계 해체 시 안전한 작업 발판을 설치하고 안전대를 사용하게 하는 등의 추락방지조치를 할 것

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.
